

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

أثر كفاءة إدارة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية على زمن إنجاز المشاريع الإنشائية بمدينة الرياض في ضوء رؤية 2030.

أسم الطالبة

رغد حسام عطية

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبد الرحيم نادر

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

تاريخ: 09/06/2060

جدول المحتويات

3	 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
4	 1.1 المقدمة:
5	 1.2 مشكلة الدراسة:
5	 1.2.1 فجوات على المستوى النظري.
5	 1.2.2 فجوات على المستوى التطبيقي.
5	 1.3 أهمية الدراسة:
5	 1.3.1 على المستوى النظري.
5	 1.3.2 على المستوى التطبيقي.
6	 1.4 أسئلة الدراسة:
6	 1.5 أهداف الدراسة:
6	 1.6 فرضيات الدراسة:
6	 1.7 نموذج الدراسة:
7	 1.8 منهجية الدراسة:
7	 1.9 الدراسة الميدانية:
7	 1.10 مخطط المشروع المقترح.
8	 الفصل الثاني: الدراسات السابقة.
9	 2.1 المقدمة:
9	 2.2 المتغير المستقل:
9	 2.3 المتغير التابع:
9	 2.4 العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
10	 2.5 الخاتمة:
10	 قائمة المراجع

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة

على الرغم من التوسع في استخدام منصة اعتماد ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، لا تزال العديد من المشاريع الإنسانية تواجه تأخيراً في الإنجاز مقارنة بالمدد المخططة لها، من ما يثير التساؤل حول مدى كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية في الإسهام بتسريع تنفيذ المشاريع وتقليل التأخير.

أظهرت الدراسات السابقة اهتماماً بالتحويل الرقمي والمشتريات الإلكترونية بشكل عام، إلا أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت أثر كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية عبر منصة اعتماد على زمن المشاريع الإنسانية في مدينة الرياض، خاصة في ضوء مستهدفات وطموح رؤية المملكة 2030.

1.2 مشكلة الدراسة

شهدت إجراءات التحول الرقمي مع إطلاق منصة اعتماد ضمن رؤية 2030، ومع إنجازات المنصة في توحيد الإجراءات وتعزيز الاستفادة منها بما يساعد في تطوير الاداء وتقليل مدة إنجاز المشاريع لتحقيق طموح الرؤية.

1.2.1 فرص على المستوى النظري

مع تزايد دراسات التحول الرقمي في التعاقدات والمشتريات، ما تزال البحوث العربية التي تقيس ابعاد كفاءة التعاقد الرقمي - السرعة، الثقة، الشفافية الموثوقة - فرص متعددة لوجود المعرفة في منصة اعتماد وتسهم الدراسة في عمق الفهم العلمي من خلال ربط الأبعاد بمؤشرات زمن إنجاز المشاريع الإنسانية ويبني إطار نظري لتوضيح كيف يتم تحويل مزايا المنصة الرقيمة الى تطوير نشاط فعلي في الأداء الزمني للمساهمة في تحقيق طموح الرؤية

1.2.2 مساهمات على المستوى التطبيقي

تتيح منصة اعتماد الرقيمة قاعدة بيانات متقدمة وتسهم الدراسة في توفير وظائف ومزايا المنصة بشكل مثالي من خلال قياس ابعادها وتقليص المدة الزمنية للمشاريع الإنسانية. كما تقدم الدراسة مؤشرات عملية لمساعدة متخذي القرار على تعزيز كفاءة الاعتماد الرقمي بما يدعم مستهدفات رؤية 2030.

ما مدى مساهمة كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية عبر منصة اعتماد الرقيمة بأبعادها في تسريع زمن إنجاز المشاريع الإنسانية بمدينة الرياض وتعزيز تحقيق هدف وطموح رؤية 2030؟

1.3. أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في إظهار القيمة المضافة لمنصة اعتماد الرقمية لدعم الكفاءة وتعزيز أداء المشاريع الإنسانية. كما تساهم في أمداد متخذي القرار بمؤشرات عملية لتعظيم الفائدة من التعاقدات الرقمية وتسريع إنجاز المشاريع لمواكبة مستهدفات وطموح الرؤية بالإضافة الى تعزيز المعرفة حول التحول الرقمي في قطاع المشتريات في مدينة الرياض.

1.3.1 على المستوى النظري:

تساهم الدراسة في بناء معرفة حيثة تربط بين كفاءة المنصات الرقمية وسرعة إنجاز المشاريع، كما تطلق للباحثين لدراسة أبعاد جديدة للتحول الرقمي وتدعم تطوير نماذج إدارية تعتمد على البيانات لتحسين الاداء.

1.3.2: على المستوى التطبيقي

تمد الدراسة في الرياض برؤية واضحة تعزز كفاءة منصة اعتماد وتقلل المدة الزمنية للتعاقد وتقدم حلول عملية تقلل التكرار وتسرع الإجراءات مما ينعكس ايجابياً على إنجاز المشاريع في وقتها وبدعم في تمكين الجودة وتطوير البنية التحتية. 2030 مستهدفات رؤية

1.4 أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي:

ما أثر كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية على تقليل زمن إنجاز المشاريع الإنسانية بمدينة الرياض؟

ويتفرع من الأسئلة الفرعية:

1. ما مستوى كفاءة إدارة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية المطبقة في المشاريع الإنسانية بالرياض؟
2. ما مدى التأخير الزمني في المشاريع الإنسانية؟
3. ما العلاقة بين كفاءة المنصات الرقمية وزمن الإنجاز؟

4. أهداف الدراسة

قياس أثر كفاءة إدارة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية على تقليل زمن إنجاز المشاريع الإنسانية.


1. تقييم كفاءة اداء المنصات الرقمية
2. تحديد مدى حجم التأخير الزمني وأسبابه في المشاريع.
3. تحليل العلاقة بين كفاءة المنصة وزمن الإنجاز.
4. تقديم مقترحات عملية لزيادة الكفاءة ورفع الإنجاز.

5. فرضيات الدراسة

توجد علاقة عكسية إحصائياً بين كفاءة إدارة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية وزمن إنجاز المشاريع الإنسانية بالرياض.

1. تؤدي زيادة كفاءة منصة اعتماد الرقمية الى تقليل دورة المشاريع.
2. تسهم الشفافية الإلكترونية الى تقليل الاعتراضات وبالتالي تقليل التأخير.
3. تساعد كفاءة الكادر بشكل أساسي على قوة العلاقة بين المنصة وزمن الإنجاز.

6. نموذج الدراسة

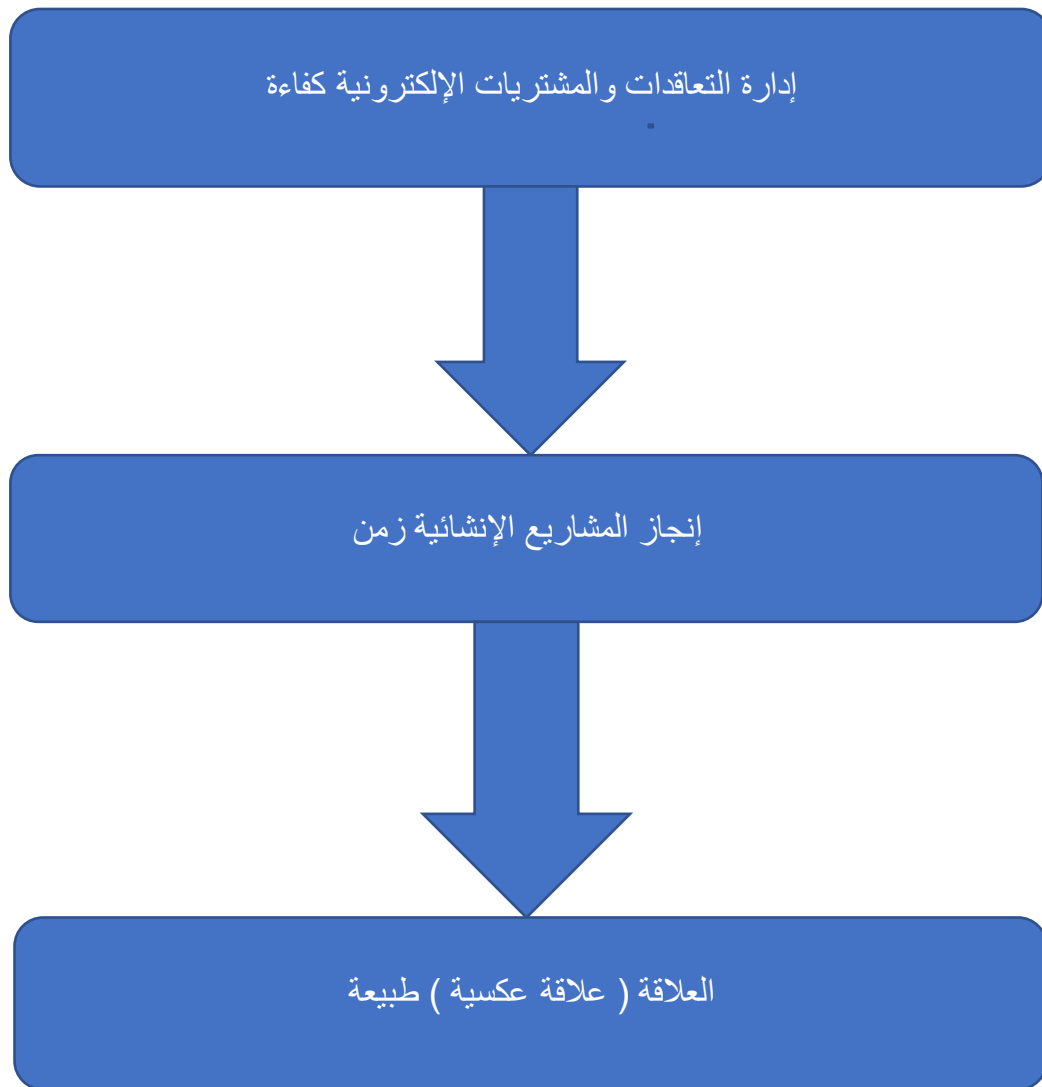

6. منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي لقياس أثر كفاءة التعاقدات الإلكترونية على زمن الإنجاز.

1. مجتمع الدراسة: الجهات المنفذة للمشاريع في مدينة الرياض.
2. عينة الدراسة: 50 مشروعاً تم طرحه والعمل عليه إلكترونياً عبر منصة اعتماد الرقمية خلال فترة 2021-2025.

3. أداة جمع البيانات: استبيان إلكتروني لمهندسي ومنسوبي التعاقدات، البيانات الثانوية المستخلصة من المنصة.

4. أسلوب التحليل: استخدام برنامج SPSS لاستخلاص المتوسطات، معامل ارتباط بيرسون، تحليل الاتحاد الخطي البسيط لاختبار الفرضيات.

7. الدراسة الميدانية

تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة المشاريع الإنشائية بمدينة الرياض والتي تم طرحها وإسنادها عبر منصة اعتماد.

أهداف الدراسة الميدانية:

1. قياس مستوى كفاءة استخدام منصة اعتماد وإدائها من وجهة نظر المستخدمين.
 2. تحديد نسبة إجاز المشروع بعد تطبيق المنصة مقارنة بالفترة السابقة.
 3. اختبار العلاقة العكسية بين الكفاءة الإلكترونية وزمن الإجاز.
- نطاق التطبيق: 50 مشروع تم إنشاؤه خلال 2021-2025 وهذا يثبت مصداقية النتائج ويدعم رؤية 2030 وأهدافها في تسريع إجاز المشاريع.

8. مخطط المشروع المقترح

يعتمد البحث على الهيكل التالي:

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

ويشمل: المقدمة، مشكلة الدراسة، الأهداف، الأهمية، الاسئلة، الفرضيات.

2. الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

ويشمل: مفهوم التعاقدات الإلكترونية، منصة اعتماد الرقمية، زمن إجاز المشاريع.

3. الفصل الثالث: منهجية الدراسة

ويوضح: المنهج، المجتمع، العينة أداة، والتحليل الإحصائي.

4. الفصل الرابع: عرض وتحليل النتائج

ويعرض: نتائج الاستبيان واختبار الفرضيات.

5. الفصل الخامس: الخاتمة والتوصية

ويتضمن: اهم النتائج والتوصيات لتسريع مدة إجاز المشروع.

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

1. المقدمة:

2. المتغير المستقل

3. المتغير التابع

4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

5. الخاتمة

قائمة المراجع

1. وزارة المالية. (2024). دليل المستخدم لمنصة اعتماد الإلكترونية. الرياض: وزارة المالية السعودية.
2. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. (2022). التعاقد الإلكتروني وأثره على كفاءة القطاع الحكومي. الرياض: سدايا.
3. رؤية المملكة العربية السعودية 2030. (2016). برنامج التحول الوطني.
