

أثر ادارة المخاطر على جودة المشاريع

دراسة تطبيقية على مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والاطفال في مدينة
الملك سعود الطبية بالرياض

مشروع تخرج -2

كلية الادارة - جامعة ميدأوشن

اسم الطالب: عهود هادي هلمان

الرقم الجامعي: 2021205265

اشراف

د. منى مصطفى العشري

عضو هيئة التدريس - كلية الادارة - جامعة ميدأوشن

الفصل الدراسي الثالث 2024

جدول المحتويات

8	1	الفصل الاول: الإطار العام للدراسة
9	1.1	المقدمة
11	1.2	مشكلة البحث
11	1.2.1	فجوات البحث على المستوى النظري
11	1.2.2	فجوات البحث على المستوى التطبيقي
12	1.3	اهمية البحث
12	1.3.1	أهمية النظرية
12	1.3.2	أهمية العملية
13	1.4	اسئلة البحث
13	1.5	اهداف البحث
14	1.6	فرضيات البحث
15	1.7	نموذج البحث
16	1.8	منهجية البحث
16	1.9	الميدانية الدراسة
17	1.10	هيكل المشروع
18	2	الفصل الثاني: الإطار النظري
19	2.1	المقدمة:
20	2.2	المتغير الأول: إدارة المخاطر:
20	2.2.1	التعريف:
20	2.2.2	التطور:
21	2.2.3	الأبعاد:
21	2.2.4	النظريات:
21	2.2.5	رسم توضيحي:
22	2.3	المتغير الثاني: جودة المشاريع:
22	2.3.1	التعريف:
22	2.3.2	التطور:
23	2.3.3	الأبعاد:
23	2.3.4	النظريات:
24	2.3.5	رسم توضيحي:
25	2.4	العلاقة بين متغيرات البحث: أثر إدارة المخاطر على جودة المشاريع:
25	2.4.1	الأنماط:
25	2.4.2	الصراعات:
25	2.4.3	الفجوات:
26	2.4.4	رسم توضيحي:

27	2.5 الخاتمة:
27	2.5.1 ملخص نتائج الإطار النظري:
27	2.5.2 مناقشة آثار البحث المستقبلية:
27	2.5.3 المساهمات الإجمالية للبحث في هذا المجال:
٢٦	٣ الفصل الثالث : منهجية البحث.
٢٧	المقدمة
٢٧	التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث
٢٨	تصميم البحث
٢٩	مجتمع البحث وتقنيات أخذ العينات
٣٠	طرق جمع البيانات
٣١	انواع البيانات
٣٢	طرق وأساليب تحليل البيانات
٣٢	الخاتمة
33	الفصل الرابع/التحليل الإحصائي
٣٤	المقدمة
٣٥	خصائص عينة الدراسة.
٣٨	قياس صدق وثبات الدراسة.
٣٨	صدق المقاييس المستخدمة في الدراسة.
٤١	ثبات اداة الدراسة
٤٢	التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة.
44	معاملات الارتباط الخطي بين متغيرات الدراسة.
٤٤	فرضيات الدراسة.
٤٩	الفصل الخامس
٥٠	المقدمة
٥٠	التوصيات
٥١	مناقشة النتائج والاستنتاجات
٥١	الخاتمة
53٥٣	3 المصادر والمراجع
	4 الملاحق56
56	4.1 الاستبيان

جدول الاشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل	رقم الصفحة
شكل 1	نموذج البحث. المصدر (الباحث، 2024)	١٢
شكل 2	تصميم البحث. المصدر (الباحث، 2024)	12
شكل 3	إدارة عناصر المخاطر. المصدر (محمد، ٢٠٢٠)	١٨
شكل 4	عناصر جودة المشاريع. المصدر (محمد ، 2020)	٢٠
شكل 5	عملية إدارة المخاطر في المشاريع. المصدر (بكواش ، ٢٠٢٢)	٢٢
شكل ٦	تصميم البحث المصدر (الطالب، ٢٠٢٤)	٢٨

قائمة الجداول:

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
٢٩	مجتمع البحث المصدر : الطالب ٢٠٢٤	١
٢٩	عينة البحث المصدر : الطالب ٢٠٢٤	٢
٣٠	المتغير المستقل المصدر : الطالب ٢٠٢٤	٣
٣١	المتغير التابع المصدر : الطالب ٢٠٢٤	٤

المستخلص:

الهدف من الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير إدارة المخاطر على جودة المشاريع في المؤسسات.

منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اختيار مجتمع الدراسة المكون من 30 موظفًا، وتطبيق الدراسة على عينة من الموظفين في برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في الرياض.

نتائج الدراسة:

تم تحليل أثر أبعاد إدارة المخاطر على جودة المشاريع ومستوى تحقيقها (مرتفع – متوسط – منخفض).

المساهمة النظرية:

تساهم هذه الدراسة في الأدبيات من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة المشاريع، مع تقديم إطار شامل لفهم تأثير هذه العلاقة على المستوى المؤسسي.

التطبيقات العملية:

تقدم الدراسة توصيات للمؤسسات حول تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر لتعزيز جودة المشاريع، مع التركيز على قياس وتحليل الأثر لتحقيق نتائج مستدامة.

الكلمات المفتاحية:

إدارة المخاطر، جودة المشاريع، التطوير المؤسسي.

Study Objective:

This study aims to explore the impact of risk management on project quality in organizations.

Study Methodology:

To achieve the study objectives, the researcher employed a descriptive-analytical method. The study population consisted of 30 employees, and the research was conducted on a sample of employees at the Women's and Children's Hospital Tower in Riyadh.

Study Results:

The study analyzed the impact of risk management dimensions (such as risk identification, assessment, and strategy development) on project quality and its levels (high – medium – low).

Theoretical Contribution:

This study contributes to the literature by highlighting the relationship between risk management and project quality, providing a comprehensive framework to understand the impact of this relationship at the organizational level.

Practical Applications:

The study offers recommendations for organizations to improve risk management strategies to enhance project quality, focusing on measuring and analyzing the impact to achieve sustainable results.

Keywords:

Risk Management, Project Quality, Organizational Development.

1 الفصل الاول: الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة

إدارة المخاطر تُعد عنصراً حيوياً لضمان جودة المشاريع في جميع المجالات، سواء كانت تجارية أو هندسية أو طبية. تهدف إدارة المخاطر إلى تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلباً على أهداف المشروع، مثل التكاليف والجودة والمدة الزمنية. من خلال التركيز المبكر على تحديد هذه المخاطر وتطبيق استراتيجيات مناسبة لإدارتها، يمكن للمشروع أن يتجنب الأزمات والتأخيرات غير المتوقعة، وبالتالي يمكنه تحقيق مستويات عالية من الجودة والكفاءة. (ديوب، 2015)

وفي سياق مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل بناء المستشفيات والمنشآت الطبية، تزداد أهمية إدارة المخاطر نظراً للتعقيدات الفنية والتشغيلية العالية. تشمل هذه المشاريع تكاليف كبيرة وتقنيات معقدة، وتتطلب استجابة سريعة للتحديات المحتملة التي قد تؤثر على جودة البناء وسير العمل بشكل عام. بفضل إدارة المخاطر الفعالة، يمكن تحديد النقاط الضعيفة المحتملة في المشروع والتعامل معها قبل أن تتفاقم وتؤثر على جودة التسليم ورضا العملاء.

من خلال تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، يمكن للمشروع أن يحقق توازناً مثالياً بين التكاليف والجودة والمدة الزمنية. فعندما يتم التنبؤ بالمخاطر المحتملة ومعالجتها بشكل فعال، يتمكن فريق المشروع من تخطيط أفضل وتنفيذ أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمشروع وتحقيق توقعات الجودة المحددة منذ البداية ويظهر البحث العديد من الدراسات التي تؤكد أن الاستثمار في إدارة المخاطر يساهم بشكل كبير في تحسين جودة المشاريع وتقليل المخاطر الناتجة عن عوامل غير متوقعة. بفضل هذا النهج، تتمكن المؤسسات والمشاريع من تعزيز سمعتها وثقة العملاء، وبناء قدراتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة بنجاح وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات المحلية. (برهوم، 2017)

وتعد إدارة المخاطر أساساً حيوياً لمشروعات البنية التحتية الطبية الكبيرة كبرج مستشفى النساء والولادة والأطفال، حيث تتضمن هذه المشاريع تقنيات ومعايير فنية دقيقة، بالإضافة إلى احتياجات متعددة للمستفيدين. يستند النجاح في مثل هذه المشاريع إلى القدرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة وإدارتها بشكل فعال، لضمان استمرارية التقدم وتحقيق أهداف الجودة والأداء المطلوبة.

إدارة المخاطر تُعتبر أساساً أساسياً لنجاح أي مشروع هندسي كبير، خاصةً في القطاع الطبي الذي يشهد تعقيدات وتحديات فنية وتشغيلية متزايدة. يتناول هذا البحث دراسة تطبيقية حول أثر إدارة المخاطر على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية

بالرياض. يعد هذا المشروع استثماراً حيوياً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم رعاية متقدمة للنساء والأطفال في المنطقة. (المدرع، 2019)

البحث ينطلق من فهم الأهمية الكبيرة لإدارة المخاطر كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة عالية. يتناول البحث تحليل العوامل المحتملة التي قد تؤثر سلباً على جودة البناء وأدائه، مثل تأخير التسليم، تكاليف زائدة، وتقلبات في الجودة. من خلال دراسة الحالة الحقيقية لمشروع بناء المستشفى، يهدف البحث إلى توضيح كيفية تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل فعال للتغلب على هذه التحديات وتحقيق أفضل النتائج في الجودة والأداء.

تُعزز هذه الدراسة من أهمية تفهم عميق للسياق المحلي والعالمي الذي يؤثر على إدارة المخاطر في مشروعات البنية التحتية الطبية. تحديد السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي يساعد على تحديد الأولويات والتحديات التي قد تكون فريدة لهذا النوع من المشاريع في المملكة العربية السعودية، مما يمهّد الطريق لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر الملائمة والمتكاملة.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين أعضاء فريق المشروع وكذلك الجهات الإشرافية والتنظيمية في تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر. يتطلب نجاح المشروع التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز من قدرة المشروع على التكيف مع التحديات المتغيرة وضمان تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة. (النسور، 2020)

ويهدف هذا البحث إلى توفير إطار فعال لفهم أثر إدارة المخاطر على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض. من خلال التركيز على التحليل الدقيق والتوجيه الاستراتيجي، يسعى البحث إلى تحقيق إضافة قيمة عملية من خلال تقديم توصيات واضحة لتحسين أداء إدارة المخاطر في مشاريع المستقبل وإبراز دور إدارة المخاطر في تحقيق أهداف الجودة في مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال، من خلال تحليل التحديات المحتملة وتقديم الاستراتيجيات الفعالة للتعامل معها بشكل مبكر وفعال.

1.2 مشكلة البحث

تفهم الأثر الفعال لإدارة المخاطر على جودة المشاريع، خاصة في مشروعات البنية التحتية الطبية كبرج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، يتطلب تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص التي تنطوي عليها هذه المشاريع الضخمة. يعد هذا المشروع استثماراً حيوياً يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وتوفير بيئة آمنة وفعالة للنساء والأطفال. يتناول هذا البحث دراسة تطبيقية لتقييم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر على جودة النتائج وأداء المشروع بشكل عام. من خلال التركيز على تحديد المخاطر المحتملة مثل التأخيرات في الجدول الزمني، زيادة في التكاليف، وتقلبات في جودة البناء.

1.2.1 فجوات البحث على المستوى النظري

على الرغم من وجود العديد من الأبحاث التي تناولت إدارة المخاطر في مشاريع البناء، إلا أن هناك فجوات في الأدبيات الحالية تتعلق بفهم التأثير المباشر لإدارة المخاطر على جودة المشاريع في قطاع البنية التحتية الطبية. العديد من الدراسات تركز بشكل أساسي على الجوانب المالية والتأخيرات الزمنية دون النظر بعمق إلى كيفية تأثير تلك المخاطر على جودة النتائج النهائية. كما أن هناك نقصاً في الدراسات التي تقدم نماذج وأطر عمل شاملة تدمج بين إدارة المخاطر والجودة في مشاريع البنية التحتية الطبية، مما يحد من القدرة على تطبيق استراتيجيات فعالة ومبتكرة في هذا المجال.

1.2.2 فجوات البحث على المستوى التطبيقي

في التطبيق، تبرز عدة فجوات تتعلق بقدرة فرق إدارة المشاريع على تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بفعالية في المشاريع الضخمة والمعقدة مثل برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية. التحديات تشمل صعوبة التواصل والتنسيق بين الأطراف المعنية، نقص التدريب المتخصص في إدارة المخاطر للبنية التحتية الطبية، وعدم وجود أدوات وتقنيات حديثة لدعم عمليات تقييم ومراقبة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتطوير مقاييس واضحة ومحددة لتقييم تأثير إدارة المخاطر على جودة المشروع، بما يساهم في تحسين الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع الكبيرة.

1.3 أهمية البحث

البحث عن أثر إدارة المخاطر على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض يحمل أهمية كبيرة و يعد البحث عن أثر إدارة المخاطر على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض خطوة هامة نحو فهم أفضل وتحسين عمليات إدارة المشاريع الكبرى في القطاع الطبي، مما يساهم في تحقيق أفضل النتائج والتقديمات الصحية للمجتمع المحلي والإقليمي.

1.3.1 أهمية النظرية

يسلط البحث الضوء على أهمية إدارة المخاطر كعنصر أساسي في نجاح المشاريع الكبرى، خاصة في القطاع الطبي الذي يتطلب دقة فنية وتنفيذية عالية. بفحص تأثير إدارة المخاطر، يمكن تحديد العوامل المحتملة التي قد تؤثر سلباً على جودة البناء والتسليم في المواعيد المحددة، وبالتالي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل هذا الأثر السلبي. هذا الجانب النظري يساهم في بناء قاعدة معرفية قوية تعزز من فهم الأدوار المتعددة لإدارة المخاطر في تحسين جودة المشاريع، ويقدم إسهاماً أكاديمياً مهماً في مجال إدارة المشاريع والبنية التحتية الطبية.

1.3.2 أهمية العملية

يقدم البحث دراسة تطبيقية محددة على حالة واقعية في مشروع بناء مستشفى، مما يساهم في تعزيز المعرفة والفهم العميق لتحديات إدارة المخاطر في هذا النوع من المشاريع. هذا التركيز العملي يساعد في تحديد أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي يمكن تبنيها في مشاريع المستقبل لتحقيق أداء متميز وجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البحث إطاراً لتطبيق إدارة المخاطر كجزء أساسي من إدارة المشاريع العامة، مما يعزز من قدرة الفرق المعنية على التكيف مع التغيرات والمتغيرات المحيطة بالمشروع. بتوفير هذا الإطار، يمكن تعزيز فعالية التخطيط والتنفيذ، وتحقيق التوازن بين الأهداف المالية والزمنية والجودوية. علاوة على ذلك، يساهم البحث في تعزيز مشاركة المعرفة والتجارب بين المهنيين في مجال إدارة المشاريع والهندسة والبناء، مما يعزز من مستوى الكفاءة والاحترافية في الصناعة. هذا التبادل يساهم في تحسين الأداء العام للقطاع وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

1.4 اسئلة البحث

- ما هي الاستراتيجيات الحالية لإدارة المخاطر المستخدمة في مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض؟
- كيف تؤثر إدارة المخاطر على جودة البناء في مشروع برج مستشفى النساء والولادة والأطفال؟
- ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المخاطر في هذا المشروع؟
- كيف يتم تقييم تأثير المخاطر على الجدول الزمني والميزانية وجودة المشروع؟
- ما هي الفوائد المستفادة من إدارة المخاطر الفعالة في مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال؟
- كيف يمكن تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر لتعزيز جودة المشاريع المستقبلية في قطاع البنية التحتية الطبية؟
- كيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية إدارة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع؟

1.5 اهداف البحث

البحث يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل في:

- فهم أثر إدارة المخاطر على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، من خلال تحليل العوامل المحتملة التي تؤثر على تنفيذ المشروع وجودته.
- تحديد التحديات والمخاطر المحتملة التي تواجه مشروعات البنية التحتية الطبية الكبرى، مثل التأخيرات في الجدول الزمني، التكاليف الزائدة، وتقلبات في جودة البناء، وكيفية التعامل معها بشكل فعال.
- تقديم توصيات واستراتيجيات عملية لتحسين إدارة المخاطر في مشروعات البنية التحتية الطبية، بهدف تحقيق أقصى قدر من الجودة والكفاءة في التنفيذ والتسليم.

- تعزيز المعرفة والفهم العميق لأهمية إدارة المخاطر بين المهنيين في مجال إدارة المشاريع والبناء، من خلال مشاركة النتائج والتجارب العملية.
- تحقيق الاستدامة في إدارة المشاريع الكبرى، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة وجودة عالية.
- يتطلع البحث إلى تحسين فهمنا وتطبيقنا لإدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية الطبية الكبرى، بهدف تحقيق أفضل النتائج والمخرجات لصالح المجتمع والمرضى المستفيدين من هذه المشاريع.

1.6 فرضيات البحث

البحث يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، وبالتالي يتمحور حول مجموعة من الفرضيات التي تسعى إلى اختبار العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة المشاريع في مشروعات البنية التحتية الطبية. فرضيات البحث يمكن أن تكون كالتالي:

1. فرضية رئيسية:


- هناك تأثير إيجابي كبير لإدارة المخاطر الفعالة على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

2. فرضيات فرعية:

- إدارة المخاطر الفعالة تقلل من التأخيرات في الجدول الزمني لمشروعات البنية التحتية الطبية.
- إدارة المخاطر الفعالة تساهم في تقليل التكاليف الزائدة في مشروعات البنية التحتية الطبية.
- إدارة المخاطر الفعالة تحسن من جودة البناء في مشروعات البنية التحتية الطبية.
- الفرق المدربة على إدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة بشكل دقيق.
- استخدام أدوات وتقنيات حديثة في إدارة المخاطر يساهم في تحسين جودة المشروع النهائية.

- التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز من جودة المشروع.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر يعزز من استدامة المشروع وثقة الأطراف المعنية.
- إدارة المخاطر الفعالة تساهم في تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والزمنية والجودة في مشروعات البنية التحتية الطبية.
- تحسين الفهم والوعي بأهمية إدارة المخاطر بين المهنيين يعزز من جودة إدارة المشاريع.
- إدارة المخاطر الفعالة تساهم في تحسين رضا المستفيدين من خدمات المشروع.

1.7 نموذج البحث

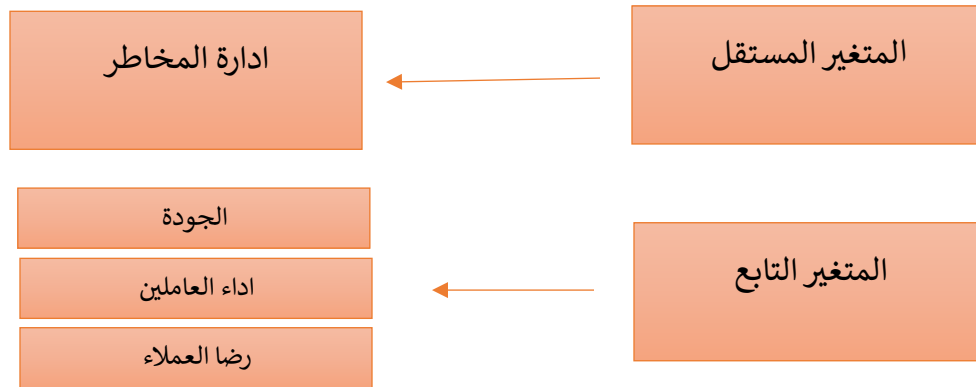

1.8 منهجية البحث

سيتم استخدام منهجية بحث وصفية تحليلية تتضمن دراسة حالة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض. سيتم جمع البيانات من خلال مقابلات مع الفرق المعنية وإجراء استبيانات وتحليل الوثائق المتعلقة بالمشروع. ستستخدم أدوات تحليل البيانات لفحص العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة المشروع.

1.9 الميدانية الدراسة

سوف يتم دراسة مدينة الملك سعود الطبية من خلال شششش برمجة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) في إجراء التحليل الوصفي والاستدلالي واختبار الفرضيات من خلال استخدام الأساليب الإحصائية التالية:

- التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية: لمعرفة خصائص العينة ومستوى شيوع الظاهرة التي هي محل البحث لدى العينة.
- معامل الارتباط (بيرسون) لقياس درجة الارتباط بين متغيرين، وقد استخدم لحساب الاتساق الداخلي، والصدق البنائي.
- اختبار ألفا كرو نباخ لمعرفة ثبات الاستبانة.
- خط الانحدار البسيط لمعرفة تأثير متغير على متغير آخر.
- خط الانحدار المتعدد لمعرفة درجة تأثير متغير على مجموعة من المتغيرات

1.10 هيكل المشروع

الفصل الأول: الاطار التمهيدي للبحث

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

اولا: الاطار النظري

مفهوم إدارة المخاطر

أهمية إدارة المخاطر في مشاريع البناء

مفهوم جودة المشاريع

أهمية الجودة في مشاريع البناء

العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة المشاريع

ثانيا: الدراسات السابقة

الفصل الثالث: منهجية البحث

مجتمع وعينة البحث

أدوات جمع البيانات

الفصل الرابع: تحليل البيانات ومناقشتها

الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

المراجع

2 الفصل الثاني: الإطار النظري

2.1 المقدمة:

تُعَد إدارة المخاطر من أهم العوامل التي تحمل أثرًا لا يمكن أن ينفصل بأي شكلٍ كان عن تعميم جهود أي مشروع نحو أهدافه بطريقة إيجابية ومنظمة، وذلك لأنها وحدة هامة داخل تخطيط الاستهداف لأي تهديد قد يصيب مساره التنموي، ومن هنا جاء الربط بين أثرها وجودة المشاريع التي تتواجد بها. (يكواش، ٢٠٢٢)

وتقديم نظرة حول الحديث الذي يدعم التقنين النظري لمثل هذا التعالق بين إدارة المخاطر وأثرها من جهة، والجودة المستدامة التي تُحقّق في المشاريع التي تكون واجدة بها، نقول إن هذا من الهام الذي بمحلّ في مقام التوسع في تطبيق التقديم المُوفّق لتسليط الضوء على بؤرة هذا الأثر وما يتعلق بماهيته وأنواعه وما يخصه. (يكواش، ٢٠٢٢)

وفي خلال هذه المساحة التي نخصصها في دراستنا لعرض الإطار النظري المتضمن لكل ما يعكس الاهتمام بكل هذا، نقف عند إدارة المخاطر كمتغير مستقل نعرض لتعريفها وأبعادها وأبرز التطورات الكائنة المتصلة بها وأهم النظريات المأخوذة في محيط تداولها كوحدة أساسية في المشروعات الناجحة، وكذلك عند جودة المشاريع ذاتها وما يُقصد منها وما يخص أبعادها وتطورها والنظريات المتصلة بها، ثم أخيرًا نستهدف جوهر ما يربط بين أثر الأولى والثانية في واقع المشروعات التي تُقام. (روايح، ٢٠٢١)

2.2 المتغير الأول: إدارة المخاطر:

2.2.1 التعريف:

يتعلق مفهوم إدارة المخاطر بما يكون لها من توظيف داخل المؤسسات التي تتبنى المشروعات الاستثمارية المختلفة من دورٍ فعّالٍ في تأطير كل التحديات الكامنة التي يمكن أن تقف حائلًا بين المتطلب إثر إقامة أيٍّ من هذه المشاريع وتحقيقه، ولذا تُعرّف على إنها: " العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار وبين المخاطر التي تصاحب هذا الاستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الاستثمار من وجهة نظر أصحابه ويمكن تعريفها أيضا بأنها إدارة الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي قد تترتب عليها خسائر محتملة الحدوث على مستوى الشركة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب"، وإنها " عملية قياس أو تحديد أو تقييم الخطر الذي تتعرض له المؤسسة أو يمكن أن تتعرض له المؤسسة في المستقبل ومن ثم تطوير الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معه أو اتخاذ الإجراءات الوقائية"، وهي في مجملها عبارة عن إجراءات تتبع لتحديد الخطط المناسبة للتعامل مع المخاطر المتنوعة داخل المنشآت والمؤسسات من خلال التعمق في التعرف ودراسة المخاطر المحتملة، وتحليلها بحيث يُتفادى أكثر أثارها السلبية بشكلٍ عام، ثم المحاولة للإفادة في هذا الصدد مما يمكن أن يكون متوائماً مع حجم الخطر ونوعه وأثره، ويتسع مفهومها بحيث إنه "يستخدم في جميع الصناعات سواء في الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو صناعة السيارات أو الأدوية وكذلك في قطاع البناء والتشييد.."، وهذا ما يجعل لها قبولاً معيارية تختلف بين قطاع وآخر من هذه المسالك النوعية التي يتدخل في إقامة حلول مناسبة لمخاطر كل منها بحيث يتحقق النجاح لها. (شيراز، ٢٠٢٢)

2.2.2 التطور:

بدأ التفكير في إدارة المخاطر منذ عام 1967م في أحداث الحريق الذي وقع في وكالة الفضاء ناسا، والذي أصاب إحدى المركبات الأمريكية وأخذ في وجهه ثلاثة من رواد الفضاء؛ فحتى هذا الوقت كان الاعتماد في تقدير مثل هذه المخاطر وغيرها يعتمد على إدارة الجودة داخل المؤسسة ولم يكن هناك إدارة مخصصة لتعيين المخاطر مُسبقاً والتعامل معها بحيث لا تقع، وهو ما حدا بالوكالة لإنشاء وحدة تكون مسؤولة عن ذلك، ومع الوقت أصبح التطور يأخذ كل مشروع أو كيان مؤسسي لوضع مثل هذه المنطقة الهامة داخل التخطيط العام لنجاحه وتجاوزه لكل خطر يهدد ذلك، ومن أبرز ما ارتبط بنشوء هذه الفكرة أيضاً وتطورها فيما بعد، ما وُجد في عام 1957م من دراسات تتوجه

لتحسين نسب الخطر لسكان يقطنون بالقرب من مفاعل نووي ويُخاف من تسرب الإشعاعات المضرة عندهم، وهنا أُقيمت الدراسات التي أدت إلى ظهور ما يُطلق عليه "التحليل الاحتمالي للمخاطر"، وفُورن هذا بتطبيقه. (محمد، ٢٠٢٠)

2.2.3 الأبعاد:

ترتبط إدارة المخاطر بمرحلية حلقات التطبيق لتوظيف فعاليتها داخل المشروعات القائمة، وذلك يكون من خلال تحليل قائم على دراسة دقيقة وإحصائيات سليمة تضمن الوصول إلى الحلول المناسبة التي تتوافق مع الخطر ونوعه؛ فقد يخصص توفر المال أو الموارد أو ظروف موقع العمل للمشروع، وكل هذا يتم فيه المعالجة لعوامل يُقدر إنها قد تتسبب في فشل العمل أو إعاقة تحقق أهدافه، وذلك من خلال التعرف على الخطر نفسه الذي يُرى إنه مما يمثل تحديًا من هذا المنطلق للقائمين على المشروع، ثم قياسه وتحليله وتقديره إلى التعامل معه بحيث يكون الوضع آمن بالنسبة لنجاح مساره. (يكواش، ٢٠٢٢)

2.2.4 النظريات:

تتموقع جهود الدارسين النظرية حول إدارة المخاطر في تنوع النظر إلى هذه الوحدة من حيث التعريف والتوجيه لمهامها في التوظيفات المختلفة لها بقطاعات العمل المؤسسي المختلفة، وذلك لا ينفي وجود أصل معرفي جامع لأساس هذا الكيان داخل أي مشروع ناشيء، وهو إنها تعالج ما هو محتمل من الخسائر والأضرار التي قد تهدد استمراريتها كما هو مخطط له. (محمد، ٢٠٢٠)

2.2.5 رسم توضيحي:

شكل: ٢ إدارة عناصر المخاطر



(محمد، ٢٠٢٠)

2.3 المتغير الثاني: جودة المشاريع:

2.3.1 التعريف:

تتعلق جودة المشاريع بضمان تحقيق أولويات الضمان لتشغيلها بحيث تكون الكفاءة متمثلة في كل أذرع النجاح للأهداف الموضوعية مُسبقاً لها، وتُعرّف الجودة في حد ذاتها على إنها: "ما يريد الحصول عليه للعميل على الرغم من الإنجاز في الوقت المحدد وبالتكلفة المحددة إلا أن الجودة هو مبتغى العميل للحصول عليه"، وهي في المقام الأول تتعلق بنجاح المشروع كصدى لتحقيق كل هذا، وهي عنصر رئيس في تلبية الاحتياجات المتعلقة بذلك الصعود بما يمثل تغلباً على العوائق والتحديات العديدة التي تكون في طريقه، والتي لا يمكن فصلها عن استفادة المتلقي للعوائد المُرحلة من المانح الذي يقف ضمناً وراء المشروع ذاته. (محمد، ٢٠٢٠)

2.3.2 التطور:

الجودة تعتبر في حد ذاتها أمرٌ حاضراً في سياق المؤسسات المختلفة التي تدعم فرص نجاح مشروعاتها وإنجازاتها أولاً بأول، وهو ما يستحضر لديها معايير تحقيق المواصفات داخل إطارها ليكون هذا ضمن تسديد الفجوة بين المؤمل والمُحقق على أرض الواقع. (شيراز، ٢٠٢٢)

تطور جودة المشاريع قد بدأ منذ الثورة الصناعية عندما بدأت الصناعات بالتركيز على تحسين الإنتاجية والكفاءة. في البداية، كان التركيز ينصب على زيادة الإنتاج وتقليل الأخطاء في خطوط الإنتاج. مع مرور الوقت، ومع ظهور نظريات الإدارة الحديثة في أوائل القرن العشرين، بدأ التركيز يتحول تدريجياً نحو الجودة كعنصر أساسي للتميز التنافسي. ظهرت مفاهيم مثل توتال كواليتي مانجمنت (TQM) والسيجما ستة، التي ركزت على تقليل الفاقد وتحسين الجودة بشكل مستمر.

مع التقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شهدت جودة المشاريع تحولات جذرية. الأدوات الرقمية مثل برمجيات إدارة المشاريع، والأنظمة المتكاملة للإدارة، وتقنيات البيانات الكبيرة، قد مكنت المنظمات من تحليل البيانات بدقة أكبر وتنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى. كما أن تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يوفر الآن إمكانيات واسعة للتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها وتحسين القرارات الإدارية بناءً على التحليلات المعقدة للبيانات. (محمد، ٢٠٢٠)

العولمة أدت إلى زيادة المنافسة بين المنظمات على مستوى العالم، مما دفع بالشركات إلى اعتماد معايير جودة دولية لضمان القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. المعايير مثل ISO ومعايير

PMI لإدارة المشاريع قد تم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر لتعكس أفضل الممارسات العالمية وتساعد المنظمات على الالتزام بمستويات جودة عالية. هذا النهج العالمي للجودة يساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة عبر الصناعات المختلفة.

رغم التقدم الكبير في مجالات جودة المشاريع، لا تزال هناك تحديات تواجه المنظمات، مثل مواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة وإدارة التنوع الثقافي في الفرق العالمية. المستقبل يبدو أنه سيشهد تركيزاً أكبر على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الجودة. المنظمات ستحتاج إلى دمج استراتيجيات جودة مبتكرة تتضمن الاستدامة كجزء لا يتجزأ من العمليات لضمان النجاح والاستمرارية في بيئة تجارية متغيرة وتنافسية. (شيراز، ٢٠٢٢)

2.3.3 الأبعاد:

تُعَدُّ الجودة قرين الاستظهار الحيوي لخصائص رئيسة تخص المشروع المرتبطة به أو المؤسسة المحتضنة لها كوحدة أساسية فيها، وذلك من خلال عناصر هامة تكون انعكاس لها به من خلال نوافذ الأداء والمظهر واستمرار المشروع بالكفاءة المتطلبة للمدة الزمنية المحددة له، وما يتعلق ببند التكلفة تزامناً مع المدة أيضاً الموضوع لإكمالها، وهذه التي يمكن أن نقول عنها إنها مقياس للحكم بالجودة عليه أو بوجود الجودة به وتحققها في تميز تكامله.

ولذلك فقسم الجودة في مؤسسات عديدة يتخذ مكانة جوهرية في إنجاز مشروعاتها من خلال متابعته لها وعمله عليها بحيث يركز الاهتمام على توفر العناصر السابقة فيه، والتوظيف لآليات فعالة تستقطب عناصر إدارة المشاريع الأساسية المتمثلة في التكلفة والوقت والمواصفات المترسمة داخل المشروع والمعايير المقترنة بنجاحه. (محمد، ٢٠٢٠)

2.3.4 النظريات:

إن الأساس النظري لفكرة الجودة يقف عند تداول الحديث حول فكرة المراقبة والمتابعة المُقَامَة بشكلٍ جماعيٍّ وليس فرديٍّ للمشاريع داخل الجهة الاستثمارية التي تستهدف إنجاز أهدافها الاقتصادية من خلال تحقيق الاحتياجات الرابطة بين الفائدة لها أو العائد لها وما سيكون من أهداف خارجية للأطراف الأخرى، وهذا ما وقف عنده الباحثين باستفاضة وعبروا من خلاله لأشكال التعامل بين قسم الجودة هذا وإدارة المشروعات، وهو ما وُجد في نطاق المراقبة من جهة النظر المدروسة من قِبَل الباحثين في دراستهم المتنوعة. (روايح، ٢٠٢١)

2.3.5 رسم توضيحي:

شكل ٣: عناصر جودة المشاريع



(محمد، ٢٠٢٠)

2.4 العلاقة بين متغيرات البحث: أثر إدارة المخاطر على جودة المشاريع:

2.4.1 الأنماط:

يوجد أنماط عدة ترتبط بإدارة المخاطر داخل المشروعات المختلفة تتنوع بما يكون مُصنّفًا وفق القطاع الذي ينتمي إليه المشروع، وكذلك بحسب مصدر الخطر هل هو السوق؟ أم الإدارة؟ أم تمويل الموارد؟ أم التعاقد ذاته على المشروع به مخاطر قانونية؟ أم تصميم المشروع؟ وتختلف أيضًا المخاطر بحسب نسبة توقع حدوثها إلى محتملة وغير محتملة، وبحسب موقعها إلى داخلية وخارجية، وبحسب درجتها إلى مخاطر شديد الأثر ترتبط بالخسائر الكبرى مثل: إفلاس المشروع بأكمله، وأخرى تقع في مرتبة أدنى منها وتكون ذات أثر كبير في اهتزاز المركز المالي دون الإفلاس، وثالثة هيّنة تتموضع في نطاق التوفيق بين أهداف المشروع وتحقيقها، وتكون صورتها هي الصراعات والتحديات التي تتمثل كعائق إلى ذلك. (روايح، ٢٠٢١)

2.4.2 الصراعات:

تمثل الصراعات بؤرة عمل إدارة المخاطر في كل مشروع تتواجد فيه عوامل خطر مالية أو غير مالية، ومن هنا تتولد قيمة وجودها كإضافة باقية بحيزه تأخذ بيد الشركة إلى خلق القرارات الاستراتيجية التي توائم معالجة الخطر المتوقع والتصدي له، ومن هنا يكون التدخل لحل مثل هذه التحديات التي تظهر كصراع بين تحقيق نجاح المشروعات والمعوقات التي قد تقف حائلًا دون تحقيق ذلك، والتي تكون في الأغلب غير متوقعة أو مُتنبأ بحدوثها، وتحمل أثرًا سلبيًا يتسلط على التحقيق المستقبلي لأهداف المؤسسة المسؤولة عن المشروع.

ويأتي الارتباط بين إدارة المخاطر وجودة المشاريع في منطقة الصراعات هذه من خلال تحديد المخاطر التي تتعرض لها أنشطة أو مشاريع الكيان الاستثماري الذي تنتمي إليه، والتعامل معها من خلال تعيين مسبباتها والآثار الناجمة عنها، وهو ما يسمح للمؤسسة بتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة وتمكّن. (روايح، ٢٠٢١)


2.4.3 الفجوات:

يرتبط أثر إدارة المخاطر بشكلٍ رئيسٍ بالمعالجة الفعّالة للمخاطر التي هي في حقيقة أمرها أزمات تقف دون نجاح المشروع من جهة أهدافه الموضوعية مُسبقًا أو مسار تنفيذه على أرض الواقع، وهي في الحقيقة الفجوة التي تُرى مُحتملة أو غير مُحتملة في طريق تقنين استراتيجية المنهاج الموضوع

بنطاق النشوء له، ومن هنا فالفجوات هي في حقيقة أمرها المخاطر بأنواعها التي تُدار لتجنب الوقوع فيه وتهديد الكيان الاقتصادي الذي يتبناه. (بكواش، ٢٠٢٢)

2.4.4 رسم توضيحي:

شكل ٤: عملية إدارة المخاطر في المشاريع

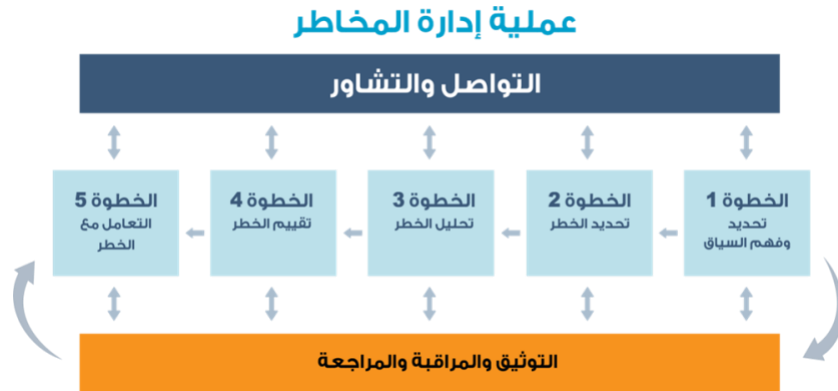

(بكواش، ٢٠٢٢)

2.5 الخاتمة:

2.5.1 ملخص نتائج الإطار النظري:

إن إدارة المخاطر جهة حيوية لا يمكن أن يكون فقدانها في أي قطاع استثماري إلا خسارة قادمة تهدد كيانه وتصور فشله القادم، ومن ثمّ فمعالجة التحديات المستقبلية من خلالها والتعامل مع أي مخاطر واجدة عنصر رئيس في إنجاح المشروعات القائمة والمؤسسة المقيمة لهم، وهذا يكون عبر خطوات دقيقة تبدأ من التعرف على الخطر وتحليله ثم التوصل لأقرب طريق يقضي على آثاره السلبية التي قد تؤثر على ضمان استمرارية عنصر الجودة فيها، وهو ما يجعلها جزء جوهري من صميم إدارة المشروعات واتخاذ القرارات التخطيطية اللازمة في الأوقات الراهنة بحيث يُتغلب على أي شيء يفشلها بالمراحل المختلفة لها التي تمر بها.

2.5.2 مناقشة آثار البحث المستقبلية:

إن الحديث عن هذا الجزء النظري الذي يخص وحدة هامة داخل صميم إقامة المشروعات من الأمور التي ستجد إقبالاً من الباحثين مستقبلياً؛ بحيث يدعم تطورها وبيان أهميتها بحيث يتم السؤال عن الأشياء التي تزيد من الإبقاء على البحث فيما يوفر عنصرى الأمن والسلامة بدرجات أكبر في المشروعات المختلفة.

2.5.3 المساهمات الإجمالية للبحث في هذا المجال:

يمثل الإسهام في هذا الميدان أهمية كبرى تنبع من قيمة إدارة المخاطر في حد ذاتها حال فعاليتها، وهذا ما يكون توفراً لقدرٍ نظريٍّ يوفر رصيد يزيد المعرفة بها ويؤكددها، ويُسهّم في الكشف عن الضرورة الملحة لمزيد من التطبيقات النظرية والعملية حول هذا الموضوع الهام.

الفصل الثالث

منهجية الدراسة

المقدمة:

يوضح هذا الفصل المنهجية المستخدمة لدراسة موضوع اثر ادارة المخاطر على جودة المشاريع دراسة تطبيقية على مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والاطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ويعرض هذا الفصل بالتفصيل التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث، وتصميم البحث ومجتمع البحث، وطرق وتقنيات أخذ العينات، وطرق جمع البيانات، وأنواع البيانات، وطرق وإجراء تحليل البيانات.

3.2 التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث:

تعتبر التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث وسيلة مهمة للباحثين فيها يتم قياس المتغيرات بوضوح، ويصف التعريف الاجرائي كيفية قياس متغير أو ملاحظته أو التلاعب به، ويساعد الباحثين على ضمان اتساق دراساتهم وموثوقيتها وصلاحياتها.

3.2.1 إدارة المخاطر

التعريف الاجرائي: إدارة المخاطر هي عملية منهجية تهدف إلى تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تواجه منظمة معينة، وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف منها أو التعامل معها، من خلال تحديد المخاطر، تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها، ووضع خطط استجابة مناسبة، مع مراقبة مستمرة لضمان فعالية الإجراءات المتخذة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. (الدبس، وآخرون، ٢٠١٥)

3.2.2 جودة المشاريع

التعريف الاجرائي: جودة المشاريع هي مجموعة من العمليات والمعايير التي تهدف إلى ضمان أن نتائج المشروع تلبي متطلبات وتوقعات المعنيين، من خلال التخطيط الجيد، وتنفيذ الأنشطة

وفق معايير محددة، ومراقبة الأداء، وتقييم النتائج، مع التركيز على تحسين العمليات والتقليل من الأخطاء، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. (الشربيني، وآخرون، ٢٠٢٣)

3.3 تصميم البحث:

فلسفة البحث: المنهج الوضعي positivism


أسلوب التحليل: استنتاجي Deductive

استراتيجية البحث: دراسة حالة Case study

أداة البحث: كمية Mono method

المدة الزمنية: مقطعية cross sectional

تقنيات تجميع البيانات: استبيان

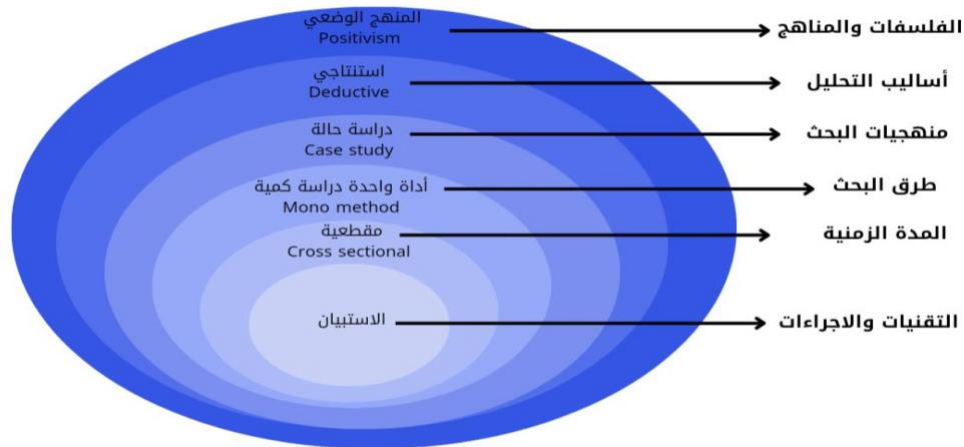

الشكل ٥

ملخص منهجية البحث

المصدر: الطالب

3.4 مجتمع البحث وتقنيات أخذ العينات

في إجراء البحوث العلمية، تُعتبر عينة البحث وتقنيات أخذ العينات من الركائز الأساسية، لأن المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من هذه العينات هي التي يتم الاعتماد عليها في إجراء التحليل الإحصائي، لذلك يجب على الباحثين توخي الدقة والموضوعية في اختيار عينة البحث وفي طرق أخذها، حتى تكون هذه البيانات ممثلة بشكل صحيح للمجتمع محل الدراسة، وهذا بدوره سيؤدي إلى نتائج بحثية موثوقة وصادقة، ويشرح هذا القسم مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وتقنيات أخذ العينة كالآتي:

3.4.1 مجتمع الدراسة

القطاع	التصنيفات	عدد الموظفين
مشروع بناء برج مستشفى	المشرفين	٥
	العاملين	٣٠

جدول رقم ١

المصدر: الطالب

3.4.2 عينة البحث

عينة البحث	حجم العينة
نستهدف العاملين في المشروع	٣٠ عامل

جدول رقم ٢

المصدر: الطالب

3.4.3 طريقة وتقنيات أخذ العينة

تم أخذ العينات بالطريقة الاحتمالية، وتقنيات أخذ العينات هي أخذ العينات العشوائية البسيطة.

3.5 طريقة جمع البيانات

سيتم تحليل البيانات التي تم جمعها إحصائياً، حيث يتضمن التحليل الإحصائي تحديد البيانات الأولية وتحليلها وتحويلها إلى معلومات مفيدة، وسيساعد هذا المنهج على كشف العلاقات الأساسية بين المتغير المستقل إدارة المخاطر والمتغير التابع جودة المشاريع دراسة تطبيقية على مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والاطفال.

3.5.1 إدارة المخاطر

اعتمد الطالب على استبانة هلمان ٢٠٢٤، من أجل قياس المتغير المستقل (إدارة المخاطر بإجمالي ١٠ عناصر للمتغير، كما أن نوع الأداة المستخدمة هي (أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة) .

المتغير المستقل

المتغيرات	الأبعاد	عدد العبارات	المصدر
إدارة المخاطر	إدارة المخاطر	١٠ عبارات	هلمان، ٢٠٢٤

جدول رقم ٣

المصدر: الطالب

3.5.2 جودة المشاريع

اعتمد الطالب على استبانة هلمان ٢٠٢٤، من أجل قياس المتغير التابع (جودة المشاريع) بإجمالي ١٠ عناصر للمتغير، كما أن نوع الأداة المستخدمة هي (أوافق بشدة أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة).

المتغير التابع

المتغيرات	الأبعاد	عدد العبارات	المصدر
جودة المشروع	جودة المشروع	١٠ عبارات	هلمان، ٢٠٢٤

جدول رقم ٤

المصدر: الطالب

3.6 أنواع البيانات

تنقسم أنواع البيانات إلى بيانات أولية وهي التي تم تجميعها من قبل الباحث وبيانات أولية تم جمعها بواسطة باحثين آخرين وهي كالآتي:

3.6.1 البيانات الأولية

- توزيع استبيانات على مجموعة من المشرفين والعاملين .
- قياس تأثير المحتمل للمخاطر غير المدارة على جودة المشروع.

3.6.1 البيانات الثانوية

- مراجعة الأبحاث السابقة لاستنباط معلومات تتعلق إدارة المخاطر
- الاطلاع على الكتب والمقالات العلمية المتعلقة بأساليب جودة المشاريع

3.7 طرق وأساليب تحليل البيانات

بعد جمع البيانات، من الضروري تحليل المعلومات التي تم جمعها لاستخلاص استنتاجات ذات معنى. حيث تم استخدام الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتحديد الإصدار 28 لتحليل البيانات المجمعة.

ولقد تم إجراء اختبار توصيف العينة، من خلال التحليل الوصفي، للحصول على نظرة ثاقبة لخصائص، مجتمع العينة، حيث يساعد ذلك الباحثين على فهم التركيبة السكانية والتفضيلات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

وتعتبر اختبارات الصلاحية والموثوقية حاسمة في ضمان دقة البيانات المجمعة واتساقها، كما أن اختبارات الصدق (التحليل العاملي الاستكشاف) تستخدم لتحديد ما إذا كانت أدوات البحث تقيس ما تهدف إلى قياسه، بينما تقوم اختبارات الثبات (اختبار كرو نباخ ألفا) بتقييم ثبات النتائج مع مرور الوقت بالأفراد المشاركين في الدراسة.

3.8 الخاتمة

تم استعراض في الفصل الثالث منهجية البحث، حيث شملت على المقدمة والتعريفات الإجرائية للبحث، وتصميم البحث، ومجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات، وطريقة جمع البيانات، وأنواع البيانات، وطرق وأساليب تحليل البيانات، وأخيرًا الخاتمة.

الفصل الرابع

التحليل الإحصائي

المقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تقديم نتائج التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من الدراسة الميدانية. تم استخدام برنامج SPSS الإصدار 28 في جميع مراحل التحليل، بدءًا من الإحصاءات الوصفية للعينة وصولاً إلى التحليل الاستدلالي. شمل التحليل تقييم أدوات الدراسة من حيث الصدق والثبات، بالإضافة إلى إجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات البحثية وتحديد العوامل المؤثرة في (جودة المشروع).

خصائص عينة الدراسة

تم توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً للجنس-الفئة العمرية-المستوى التعليمي ثم حساب التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وتتمثل في المعلومات الديموغرافية التي تشمل:

البيانات الشخصية

الجنس

- ☐ ذكر
- ☐ انثى

العمر

- ☐ من 20-25
- ☐ من 26-30
- ☐ من 31-40

المستوى التعليمي


- ☐ الثانوية العامة
- ☐ بكالوريوس
- ☐ ماجستير
- ☐ دكتوراه

المتغير	فئات المتغير	العدد	النسبة من إجمالي العينة
الجنس	١. ذكر	١١	٪٣٦
	٢. أنثى	٢٠	٪٦٤
	الإجمالي	٣١	100%
الفئة العمرية	من ٢٠ إلى ٢٥ سنة	١١	٪٣٦
	من ٢٦ إلى ٣٠ سنة	١٣	٪٤١
	من ٣١ إلى ٤٠ سنة	٢	٪٦
	من ٤٠ سنة فأكثر	٥	٪١٦
	الإجمالي	٣١	100%
	ثانوية العامة	٦	٪١٦
المؤهل الدراسي	بكالوريوس	٢٢	٪٧٠

ماجستير	٢	٦٪
دكتوراه	١	٣٪
الإجمالي	٣١	100%


من بيانات جدول رقم 5 تم استخلاص النتائج التالية:

الجنس: أظهرت نتائج الإحصائية أن عدد الذكور الذين جاوبوا على الاستبيان بلغ عددهم (١١)، بنسبة (٣٦٪) بينما بلغ عدد الإناث (٢٠) مفردة بنسبة (٦٤٪) من إجمالي العينة، كما هو موضح بالشكل التالي:

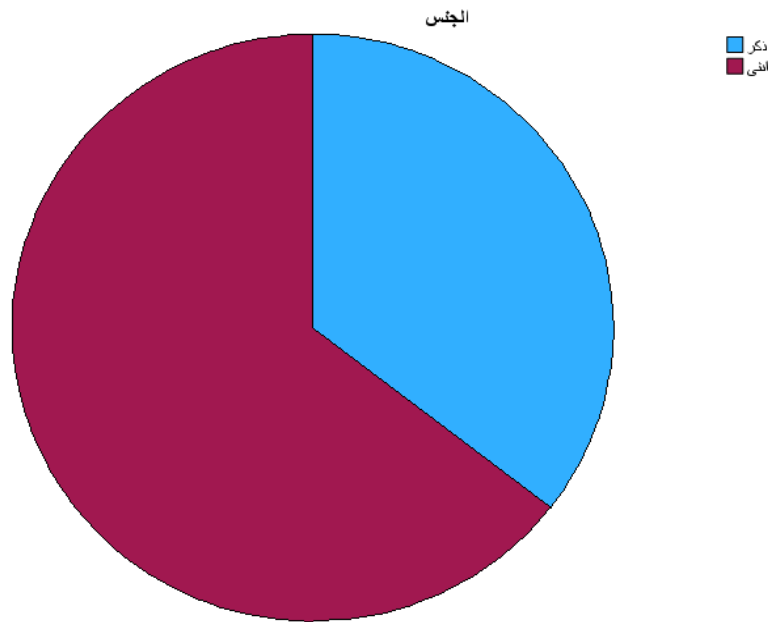


تصنيف العينة وفق الجنس

الفئة العمرية: أظهرت النتائج الإحصائية أن (١١) مفردة تبلغ أعمارهم بين (٢٠ الى ٢٥ سنة) وهم يمثلون (٣٦٪)، وبلغ عدد الافراد الذين تبلغ أعمارهم بين (٢٦ الى ٣٠ سنة) يساوي (١٣) مفردة بنسبة (٤١٪) من العينة، أما الذين تتراوح أعمارهم بين (٣١ الى ٤٠ سنة) فهم (٢) مفردة بنسبة (٦٪) اما الذين تتراوح أعمارهم (فوق ٤٠) فهم (٥) بنسبة (١٦٪) من إجمالي العينة، وفقاً للشكل التالي:

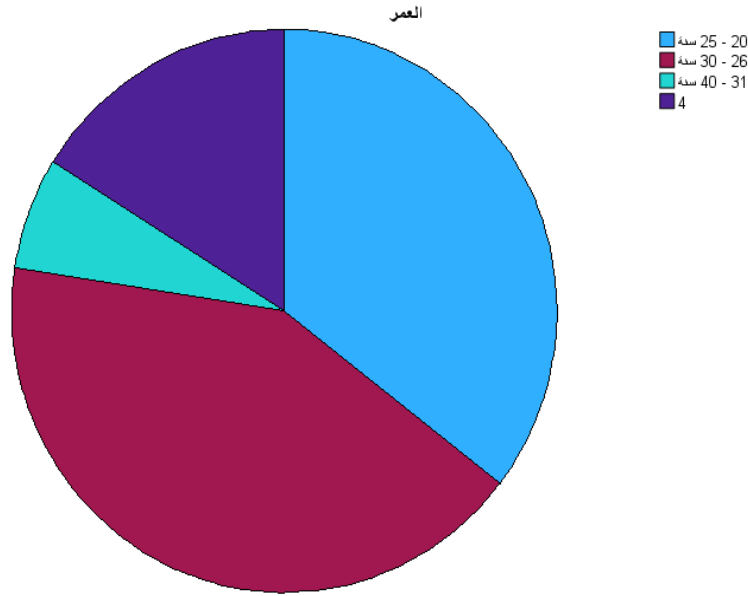

تصنيف عينة الدراسة وفق العمر

المؤهل العلمي: بلغ عدد الأشخاص ذو المؤهل (ثانوية العامة) ما يصل إلى (٦) بنسبة (١٦٪) أما الذين مؤهلهم (بكالوريوس) فعددهم (٢٢) مفردة بنسبة (٧٠٪) أما (ماجستير) فبلغ عددهم (٢) بنسبة (٦٪) وبلغ عدد الحاصلين على مؤهل (دكتوراه) ما يصل إلى (١) بنسبة (٣٪).

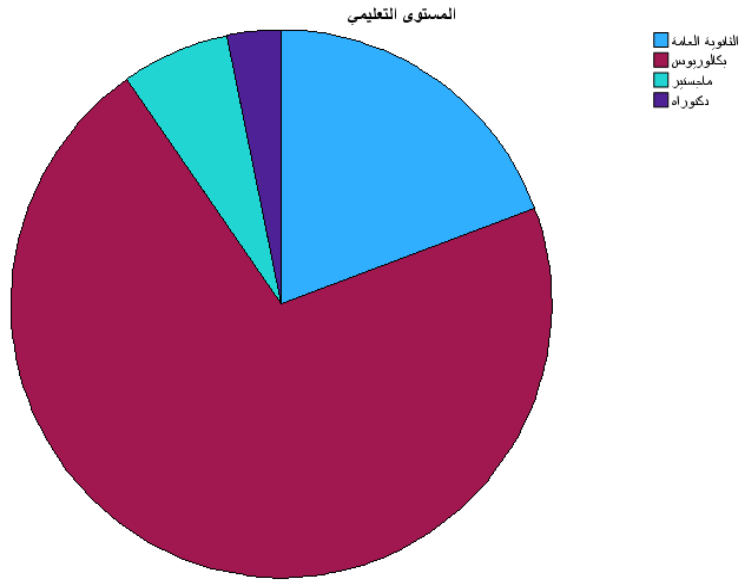

تصنيف عينة الدراسة وفق المؤهل العلمي

قياس صدق وثبات الدراسة

تم إجراء تحليل للصدق والثبات للمقاييس المستخدمة في الدراسة بهدف التأكد من دقتها وموثوقيتها، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام نموذج المعادلات البنائية، لتحليل البيانات وتحقيق الثبات الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ، ولقد تم تنفيذ جميع التحليلات الإحصائية باستخدام برنامج SPSS الإصدار 28، والفقرات والجداول التالية توضح ذلك. (إعادة صياغة النص ووضعه كما هو)

صدق المقاييس المستخدمة في الدراسة

لقد تم اختيار صدق الاتساق الداخلي كأحد معايير الصدق، وتم قياسه باستخدام معامل ألفا كرونباخ، كما تم حساب متوسط التباين المستخرج (AVE) لتقييم الصدق التقاربي بين البنود عن طريق قياس متوسط التباين المستخرج. (Average Variance Extracted)

صدق الاتساق الداخلي: يقصد به مدى اتساق كل عبارة من عبارات الاستبانة للمتغير الذي ينتمي إليه، لذا قام الباحث بقياس الاتساق الداخلي للاستبانة من خلال حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمتغير التي تنتمي إليه، وفقاً لدراسة (1974) kaiser معامل الارتباط أقل من 0.5 يتم حذفه من الاستبانة. (إعادة صياغة النصوص السابقة ووضعها كما هي)

Average variance extracted متوسط التباين المستخرج		P Values	Standard deviation الانحراف المعياري	Factor loadings معامل الارتباط	KMO	Statements العبارات	Variable المتغير	
4,8961	4,8961	0,00	0,77321	837	0,680	A1	إدارة المخاطر	إدارة المخاطر
		0,00	0,68155	0,709		A2		
		0,00	0,86385	0,795		A3		
		0,00	0,016001	0,880		A4		
		0,00	0,81650	0,612		A5		
		0,00	0,92864	0,701		A6		
		0,00	0,96386	0,682		A7		
		0,00	0,85635	0,874		A8		
		0,00	0,83344	0,826		A9		
		0,00	0,92864	0,761		A10		
3,9502	3,9502	0,00	0,147231	0,690	0,569	A1	جودة المشروع	جودة المشروع

0,00	0,003221	0,592
0,00	0,011761	0,749
0,00	0,203041	0,915
0,00	0,121631	0,844
0,00	0,98265	0,751
0,00	0,93441	0,829
0,00	0,98045	0,801
0,00	0,011761	0,723
0,00	0,89443	0,756

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

يتضح من الجدول بالأعلى:

مقياس تطبيق المتغير الأول: جميع معاملات الارتباط لكل العبارات ترتبط ارتباط قوي مع المتغير التابعة لها (إدارة المخاطر) عند قيم أكبر من 0/7 بالإضافة إلى أن قيم كل معاملات الارتباط للعبارات دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 0/001، وفقاً لذلك فقد تحقق صدق الاتساق الداخلي للمقياس، كذلك بالنسبة للنتائج بالأعلى المتعلقة بقيمة متوسط التباين المستخرجة AVE يتضح أن

قيمته للمتغير (إدارة المخاطر) هو (4,8961) < 0.5 وفقاً لذلك فقد تحقق الصدق التقاربي للاستبانة.

مقياس تطبيق المتغير الثاني: مقياس تطبيق المتغير الثاني جميع معاملات الارتباط للعبارات التي تقيس (جودة المشروع) قيمتها أكبر من ٧/٠ بالإضافة إلى أن قيم كل معاملات الارتباط للعبارات دالة احصائياً عند مستوى معنوية أقل من 0.0001 وفقاً لذلك فقد تحقق صدق الاتساق الداخلي للمقياس، كذلك من النتائج بالأعلى المتعلقة بقيمة متوسط التباين المستخرج AVE للمتغير (جودة المشروع) ككل الذي يساوي (3,9502) وفقاً لذلك، فقد تحقق الصدق التقاربي للاستبانة.

ثبات أداة الدراسة

يشير ثبات الاستبيان إلى استقرار نتائجه عند إعادة توزيعه على نفس العينة في أوقات مختلفة. لضمان ثبات الاستبيان، تم حساب معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج SPSS الإصدار 28. ووفقاً لمعايير (Hair et al, 2010)، تُعتبر قيمة ألفا كرونباخ التي تتجاوز 0.7 مؤشراً جيداً على ثبات المقياس.

Cronbach's alpha		Number of Statements عدد العبارات	Variable المتغير	
0,814	0,827	10	إدارة المخاطر	إدارة المخاطر
	0,807			
	0,795			
	0, 789			
	0,792			
	0,797			
	0,799			

	0,781 0,780 0,806			
0,841	0,845 0,813 0,829 0,820 0,835 0,822 0,830 0,826 0,817 0,821	10	جودة المشروع	جودة المشروع

(إدارة المخاطر): أظهرت النتائج الإحصائية أن قيم ألفا كرونباخ هي (0,814) ، مما يدل على أن جميع القيم أكبر من 0,7 ووفقاً لـ (هير وآخرون، 2010) فقد تحقق ثبات المقياس.

(جودة المشاريع): أظهرت النتائج الإحصائية أن قيم ألفا كرونباخ هي (0,841) ، مما يدل على أن جميع القيم أكبر من 0,7 ووفقاً لـ (هير وآخرون، 2010) فقد تحقق ثبات المقياس.

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:

موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
------------	-------	-------	-----------	----------------

وقد تم حساب مستوى الأهمية وفقاً للمعادلة التالية:

تم حساب الوزن النسبي المقابل لكل فئة عن طريق ضرب المتوسط الحسابي في $100 \div 5$ (المقياس الخماسي) = 20%

يوضح الجدول التالي دلالة المتوسطات الحسابية، كما يلي:

يبين الجدول في الأعلى التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ممثلة بالمتوسطات الحسابية بناء على مقياس ليكرت الخماسي والانحرافات المعيارية للمتغيرات وفقا للجدول المتعلق بأهمية المتوسط الحسابي.

قيمة المتوسط الحسابي	النتيجة (الاتجاه العام)	الوزن النسبي %	مستوى (درجة) الممارسة / الأهمية
من 1 إلى أقل من 1.80	غير موافق بشدة	من 20 إلى أقل من 36%	منخفض جدا
من 1.80 إلى أقل من 2.60	غير موافق	من 36 إلى أقل من 52%	منخفض
من 2.60 إلى أقل من 3.40	محايد	من 52 إلى أقل من 68%	متوسط
من 3.40 إلى أقل من 4.20	موافق	من 68 إلى أقل من 84%	مرتفع
من 4.20 إلى أقل من 5	موافق بشدة	من 84 إلى أقل من 100%	مرتفع جدا

المتغير		المتوسط الحسابي		الاتجاه العام		مستوى الأهمية	
إدارة المخاطر	إدارة المخاطر	4,8961	4,8961	موافق بشدة	موافق بشدة	مرتفع جدا	مرتفع جدا
جودة المشروع	جودة المشروع	3,9502	3,9502	موافق	موافق	مرتفع	مرتفع

معاملات الارتباط الخطي بين متغيرات الدراسة:

يعرض الجدول التالي معاملات الارتباط الخطي (بيرسون) بين متغيرات الدراسة، والتي تم قياسها باستخدام SPSS-V.28 وذلك على النحو التالي:

إدارة المخاطر	إدارة المخاطر على جودة المشاريع	
0,792	Pearson correlation	جودة المشاريع
<0,01	Sig. (2-tailed)	
31	N	

نتائج اختبار صدق فرضيات الدراسة:

الفرضيات:

1. فرضية رئيسية:

- هناك تأثير إيجابي كبير لإدارة المخاطر الفعالة على جودة مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

2. فرضيات فرعية:

- إدارة المخاطر الفعالة تقلل من التأخيرات في الجدول الزمني لمشروعات البنية التحتية الطبية.

- إدارة المخاطر الفعالة تساهم في تقليل التكاليف الزائدة في مشروعات البنية التحتية الطبية.
- إدارة المخاطر الفعالة تحسن من جودة البناء في مشروعات البنية التحتية الطبية.
- الفرق المدربة على إدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة بشكل دقيق.
- استخدام أدوات وتقنيات حديثة في إدارة المخاطر يساهم في تحسين جودة المشروع النهائية.
- التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز من جودة المشروع.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر يعزز من استدامة المشروع وثقة الأطراف المعنية.
- إدارة المخاطر الفعالة تساهم في تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والزمنية والجودة في مشروعات البنية التحتية الطبية.
- تحسين الفهم والوعي بأهمية إدارة المخاطر بين المهنيين يعزز من جودة إدارة المشاريع.
- إدارة المخاطر الفعالة تساهم في تحسين رضا المستفيدين من خدمات المشروع.

العلاقة بين إدارة المخاطر على جودة المشاريع :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,792 ^a	,628	,615	,41075

a. Predictors: (Constant), المتغير_الاول


ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,2618	1	,2618	,96748	<.001 ^b
	Residual	,8934	29	,169		
	Total	,15413	30			

a. Dependent Variable: المتغير_الثاني

b. Predictors: (Constant), المتغير_الاول

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,243	,279		,872	,390
	المتغير_الاول	,984	,141	,792	,9986	<.001

a. Dependent Variable: المتغير_الثاني



مناقشة النتائج والاستنتاجات

المقدمة

يركز هذا الفصل على استكشاف الأبعاد النظرية والتطبيقية لتأثير إدارة المخاطر على جودة المشاريع، حيث يتناول تحليل العوامل التي تجعل إدارة المخاطر أداة حاسمة لضمان تحقيق معايير الجودة في تنفيذ المشاريع، يناقش الفصل التحديات التي قد تواجه المؤسسات أثناء تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مع تقديم حلول عملية لتجاوز هذه العقبات وتحسين فعاليتها، كما يتضمن الفصل عرضاً للتوصيات المستخلصة من نتائج الدراسة والمقترحات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز فهم العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة المشاريع، ويختتم الفصل بملخص شامل لأهم النتائج والاستنتاجات.

التوصيات

- تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم المشاريع.
- توفير برامج تدريبية لفريق العمل لتعزيز مهاراتهم في تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها.
- استخدام أدوات تحليلية وتقنيات حديثة لتحديد المخاطر المحتملة وتقييم تأثيرها على جودة المشروع.
- تضمين إدارة المخاطر كجزء أساسي من عملية تخطيط المشروع لضمان تحقيق الأهداف بجودة عالية.
- تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع لضمان فهم واضح للمخاطر المشتركة وكيفية التعامل معها.
- إنشاء نظام رصد وتقييم دوري للمخاطر لضمان الاستجابة السريعة للتغيرات غير المتوقعة.
- تحسين عمليات توثيق المخاطر والخطط الاستباقية لتكون مرجعاً في المشاريع المستقبلية.
- تعزيز ثقافة إدارة المخاطر داخل المؤسسة لدعم استدامة الجودة في جميع المشاريع.

مناقشة النتائج والاستنتاجات

الحدود الموضوعية:

تقتصر الدراسة على إدارة المخاطر وأثرها على جودة المشاريع.

الحدود البشرية:

تقتصر الدراسة على الموظفين في برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في الرياض.

الحدود المكانية:

تقتصر الدراسة على النطاق الجغرافي لبرج مستشفى النساء والولادة والأطفال في الرياض.

الحدود الزمنية:

تم إجراء الدراسة خلال العام 2024.

الخاتمة

تعد إدارة المخاطر أداة استراتيجية أساسية لتحقيق جودة المشاريع، حيث تساهم في تقليل التحديات التي تواجه المشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للمعايير المطلوبة، تناولت هذه الدراسة موضوع إدارة المخاطر وعلاقتها بجودة المشاريع من خلال خمسة فصول متكاملة، قدمت تحليلاً شاملاً للجوانب النظرية والتطبيقية لهذا الموضوع الحيوي.

في الفصل الأول، تم تسليط الضوء على مشكلة البحث وأهميته، حيث ركزت الدراسة على الحاجة إلى تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر لضمان تحقيق معايير الجودة في المشاريع، كما تم تحديد أهداف البحث وأسئلته التي وجهت الدراسة لاستكشاف العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة المشاريع.

أما الفصل الثاني، فقد تناول استعراض الأدبيات السابقة المتعلقة بإدارة المخاطر وجودة المشاريع، حيث تمت مناقشة النماذج والنظريات التي تدعم أهمية تضمين إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من عملية إدارة المشاريع. ساعد هذا الفصل في تحديد الفجوات البحثية التي تناولتها الدراسة الحالية، مما يضيف بُعداً علمياً جديداً في هذا المجال.

في الفصل الثالث، تم تقديم تعريفات إجرائية دقيقة لمتغيرات الدراسة، مثل إدارة المخاطر وجودة المشاريع، لضمان وضوح المفاهيم المستخدمة، كما تم توضيح المنهجية العلمية المستخدمة في الدراسة، بما في ذلك أدوات البحث، تصميم العينة، وأساليب جمع وتحليل البيانات، مما عزز مصداقية النتائج.

تناول الفصل الرابع عرض نتائج البحث، حيث كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية قوية بين تطبيق ممارسات فعالة لإدارة المخاطر وتحقيق جودة عالية في المشاريع، أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على تقنيات حديثة وخطط استباقية لإدارة المخاطر تتمكن من تحقيق أهدافها بكفاءة أعلى وتقليل الأخطاء والتأخيرات التي قد تؤثر على جودة المشاريع.

في الفصل الخامس، تم تقديم توصيات عملية مستندة إلى نتائج البحث، شملت ضرورة تعزيز مهارات فريق العمل في إدارة المخاطر، ودمج إدارة المخاطر كجزء أساسي من تخطيط وتنفيذ المشاريع، كما اقترحت الدراسة تعزيز استخدام الأدوات التحليلية الحديثة لتحسين دقة التنبؤ بالمخاطر وتطوير استراتيجيات استباقية للتعامل معها.

في ختام الدراسة، يتضح أن إدارة المخاطر ليست فقط وسيلة لتجنب الفشل، بل هي عنصر حاسم في تحقيق جودة المشاريع وضمان استدامتها، تقدم هذه الدراسة إطارًا عمليًا يمكن للمؤسسات الاعتماد عليه لتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز جودة المشاريع وتحقيق الأهداف المؤسسية، كما تفتح الدراسة المجال أمام أبحاث مستقبلية تركز على استكشاف تأثير إدارة المخاطر في سياقات صناعية وتنظيمية مختلفة، مما يساهم في تطوير فهم أعمق لهذا الموضوع وتحقيق المزيد من النجاح في إدارة المشاريع.

3 المصادر والمراجع

1. أديب برهوم. (2017). واقع عملية إدارة المخاطر في شركات المقاولات دراسة مسحية على شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري. مجلة جامعة تشرين-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية. 39(6)
2. بخيت المدرع, س., & سفر. (2019). تقويم إدارة مخاطر الموارد البشرية بالجامعات السعودية وفقا لمعيار المنظمة الدولية للمعايير لإدارة الخطر ، دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والأهلية. مجلة كلية التربية (أسيوط), 35(5)
3. بكوش، مهاء (2022). أثر إدارة المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للمشاريع - دراسة حالة مؤسسة بيكو. مجلة معهد العلوم الاقتصادية، 25(1)
4. التعمري، رنا خليل (2021) أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية الخضراء على ريادة الأعمال، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسراء، عمان، الأردن.
5. جمعة سيد هارون، (2020) اثر الإبداع التنظيمي على ريادة الأعمال، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الإدارية، مجلد (57)، العدد (5).
6. خالدة علاء أحمد مسلم (2020) أثر ريادة الأعمال على أداء الشركات الصناعية في المناطق التنموية الاردنية في أقليم الشمال، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ال البيت، المفرق الأردن.
7. روابح، بومدين نجيب. (2021). إدارة مخاطر المشاريع الناشئة في الجزائر دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. رسالة ماجستير، جامعة محمد البشير الابراهيمى، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
8. السهيمي، محمد. (2020). "إدارة مشاريع المعرفة وأهميتها في المؤسسات التعليمية والجامعات في القطاعين العام والخاص" شبكة المؤتمرات العربية، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر، ص33.
9. شيراز، محمد خضر. (2022). إدارة مخاطر المشاريع. تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع. ط1، دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع.

10. العوضي، فايزة خير الله ناصر بن عبدالله (2020) دور مهارات التخطيط الاستراتيجي في تعزيز ريادة الأعمال، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد (1)، ص 254-291.
11. الغامدي عبدالله، وآخرون (2023) "مفاهيم أساسية في إدارة معرفة المشاريع". مجلة بحوث الشرق الأوسط. 290-308, 11(88).
12. محمد ديوب, & ولاء زريقة. (2015). دور إدارة مخاطر المشروعات في جودة اتخاذ القرارات دراسة مسحية على شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري. مجلة جامعة تشرين-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 37(5).
13. محمد، عبود طاهر (2020). تأثير إدارة المخاطر الفاعلة في نجاح المشروعات: دراسة تطبيقية في عينة من مشروعات البناء والتشييد الحكومية والخاصة في محافظة البصرة. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة، 13(27).
14. الموقع الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية،
<https://publicportal.ksmc.med.sa/Pages/default.aspx>
15. النجار، عمر محمد خليل، والفراء ماجد محمد عبد السلام (2019)، أثر إدارة المخاطر على التميز المؤسسي لجامعة الأقصى بقطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
16. النسور، بلال والخرارية، عبد الحميد (2020) ريادة الأعمال، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
17. الدبس، وآخرون، ٢٠١٥، تطوير منهجية لتحليل وإدارة مخاطر مشاريع السدود في سورية
18. الشربيني، وآخرون، ٢٠٢٣، عوامل النجاح الحرجة من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المشاريع التشييد
19. هلمان، ٢٠٢٤، إستبيان إدارة المخاطر، استبيان جودة المشروع، أثر إدارة المخاطر على جودة المشاريع.

20. Al-Shbail, T. (2020), "The impact of risk management on revenue protection: an empirical evidence from Jordan customs", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 14 No. 3
21. Arabi, N.G.A. and Abdalla, A.M.A. (2020), "The role of ecosystem for entrepreneurship development in Sudan", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 16 No. 4
22. Bolzani, D. and Luppi, E. (2021), "Assessing entrepreneurial competences: insights from a business model challenge", Education + Training Vol. 63 No. 2
23. costa, J. and Pita, M. (2021), "Entrepreneurial initiative in Islamic economics - the role of gender. A multi-country analysis", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 6

4 الملاحق

4.1 الاستبيان

من خلال الدراسة المجتمعية أضع بين يديكم استبيان لقياس أثر إدارة المخاطر على جودة المشاريع بدراسة تطبيقية على مشروع بناء برج مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، يرجى الإجابة على الأسئلة بوضع علامة (✓) على الخيار المناسب ويجب أن تعلم أنه لا توجد إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، فالهدف هو قياس وجهات نظرک.

المعلومات الديموغرافية

الجنس

- ☐ ذكر •
- ☐ انثى •

العمر

- ☐ من 25-20 •
- ☐ من 30-26 •
- ☐ من 40-31 •

المستوى التعليمی

- ☐ الثانوية العامة •
- ☐ بكالوريوس •
- ☐ ماجستير •
- ☐ دكتوراه •

المتغير الاول: ادارة المخاطر

الرقم	اسئلة المتغير الاول (ادارة المخاطر)	اوافق بشدة	اوافق	محايد	لا اوافق	لا اوافق بشدة
1	هل يتم تحديد المخاطر المحتملة في المشروع بوضوح منذ البداية؟					
2	هل توجد خطة إدارة مخاطر مفصلة للمشروع؟					
3	هل يتم تحديث خطة إدارة المخاطر بشكل دوري؟					
4	هل يتم تقييم تأثير كل خطر على المشروع بشكل دقيق؟					
5	هل تتوافر الموارد اللازمة لإدارة المخاطر بشكل فعال؟					
6	هل يتم تدريب فريق العمل على كيفية إدارة المخاطر؟					

					هل يتم التواصل بانتظام مع جميع الأطراف المعنية بشأن المخاطر المحتملة؟	7
					هل توجد إجراءات محددة للحد من تأثير المخاطر عند حدوثها؟	8
					هل يتم استخدام أدوات وتقنيات حديثة لتقييم ومراقبة المخاطر؟	9
					هل يتم توثيق جميع المخاطر التي تم التعرف عليها والإجراءات المتخذة لإدارتها؟	10

المتغير الثاني: جودة المشروع

المعلومات الديموغرافية

الجنس

• ☐ ذكر

• ☐ انثى

العمر

• ☐ من 20-25

• ☐ من 26-30

• ☐ من 31-40

المستوى التعليمي

• ☐ الثانوية العامة

• ☐ بكالوريوس

• ☐ ماجستير

• ☐ دكتوراه

الرقم	اسئلة المتغير الاول (جودة المشروع)	اوافق بشدة	اوافق	محايد	لا اوافق	لا اوافق بشدة
1	هل تم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع؟					
2	هل تم الالتزام بالميزانية المحددة للمشروع؟					
3	هل كانت جودة البناء مرضية وتلبي المعايير المطلوبة؟					
4	هل تم تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات الفنية المحددة؟					
5	هل كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالجودة أثناء تنفيذ المشروع؟					
6	هل تم تلبية توقعات العملاء أو المستفيدين من المشروع؟					
7	هل كانت هناك أية إعادة عمل أو تصحيحات بسبب مشاكل في الجودة؟					
8	هل كانت المواد المستخدمة في البناء ذات جودة عالية؟					
9	هل كان هناك رقابة فعالة على جودة العمل أثناء التنفيذ؟					
10	هل كانت هناك أية تحسينات في الجودة نتيجة لإدارة المخاطر الفعالة؟					
