



جامعة ميدأوشن
كلية الإدارة
بكالوريوس إدارة المشاريع

أثر العوامل المؤثرة على نجاح المشاريع في قطاع صناعة البناء دراسة ميدانية على مشاريع السعودي ة

اسم الطالب ة

منيرة سنيد الحربي

الرقم الجامعي

221001568

مشروع التخرج 1

كلية إلا دارة-جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبد الرحيم نادر

عضو هيئة التدريس

كلية الإدارة المشاريع- جامعة ميدأوشن

الفصل الدراسي الثاني – 2025

جدول المحتويات

3	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
4	1.1. المقدمة:
5	2.1. مشكلة الدراسة
5	1.2.1. فجوات على المستوى النظري
5	2.2.1. فجوات على المستوى التطبيقي
5	3.1. أهمية الدراسة
5	1.3.1. على المستوى النظري:
5	2.3.1. على المستوى التطبيقي:
6	4.1. أسئلة الدراسة
6	5.1. أهداف الدراسة
6	6.1. فرضيات الدراسة
6	7.1. نموذج الدراسة
7	8.1. منهجية الدراسة
7	9.1. الدراسة الميدانية
7	1. مخطط المشروع المقترح 10
8	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

.....	<u>1. المقدمة:</u>	<u>2.</u>
9		
9	<u>2.2. المتغير المستقل</u>	
9	<u>3.2. المتغير التابع</u>	
.....	<u>4.2. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ع</u>	
9		
.....	<u>5.2. الخاتمة</u>	
		10
.....	<u>قائمة المراجع</u>	
10		

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

المقدمة

التمهيد:

يعد قطاع صناعة البناء من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لما له من دور مباشر في دعم التنمية العمرانية وتوسيع البنية التحتية ويشهد هذا القطاع توسع ملحوظا ضمن رؤية المملكة 2030، مما يتطلب تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية عالية. ومع هذا النمو المتسارع، تزداد الحاجة إلى دراسة العوامل التي تضمن نجاح المشاريع وتقلل من نسب الفشل أو التعثر .

مشكلة البحث:

على الرغم من التطور في تقنيات وأساليب تنفيذ المشاريع، إلا أن نسبة كبيرة من مشاريع البناء لا تحقق أهدافها المرجوة من حيث الوقت أو التكلفة أو الجودة. هذا يشير إلى وجود فجوة معرفية في فهم وتحليل العوامل التي تؤثر فعليا على نجاح المشاريع في بيئة البناء السعودية، مما يستدعي البحث في تلك العوامل ومقدار تأثيرها.

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذه الدراسة في مساهمتها بتقديم معرفة علمية وميدانية تساعد أصحاب القرار ومديري المشاريع في قطاع

البناء على تحديد العناصر الأساسية التي يجب التركيز عليها لرفع في نجاح المشروع. كما تدعم الدراسة تحسي ن ممارسات إدارة المشاريع بما ينسجم تطلعات التنمية الوطنية.

أهداف البحث:

- تحديد أبرز العوامل الإدارية والمالية والبشرية المؤثرة على نجاح مشاريع البناء.
- قياس أثر تلك العوامل على أداء العام للمشروع .
- تقديم توصيات قابلة للتطبيق لتحسين إدارة مشاريع البناء في المملكة.

منهجية البحث:

يعتمد البحث عن المنهج الكمي باستخدام أداة الأستانة لجمع البيانات من عينة من العاملين في قطاع البناء مشاريع مهندسين إداريين وقد تم تصميم الاستبانة لقياس أثر العوامل المختلفة على نجاح المشاريع ثم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية لاستخلاص النتائج.

مشكلة الدراسة :

يعد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية من أكثر القطاعات نشاطاً ونمواً ومع ذلك، لا تزال العديد من المشاريع تعاني من تحديات تؤثر على نجاحها، مثل التأخير، وتجاوز التكاليف، وضعف الجودة. وتشير التقارير إلى أن بعضها هذه التحديات تعود إلى عوامل إدارية أو مالية أو بشرية، ولكن مازال هناك نقص في الفهم العميق لهذه العوامل وآثارها الفعلي على نجاح المشاريع، خاصة في السياق السعودي. ولهذا تطرح مشكلة البحث في ضوء الفجوات التالية:

فجوات على المستوى النظري:

قلة الدراسات الحديثة التي تدمج بين العوامل الإدارية والمالية والموارد البشرية ضمن نموذج شامل يوضع علاقتها بنجاح المشاريع .

محدودية النماذج النظرية التي تم اختيارها في بيئة البناء السعودية ما اعتمد بعض الدراسات على إطار أجنبية قد لا تعكس الواقع المحلي .

تباين التعريفات والمفاهيم المستخدمة لمفهوم نجاح المشروع مما يؤثر على دقة القياس والتحليل في الدراسات السابقة.

فجوات على المستوى التطبيقي:

- غياب الدراسات الميدانية التي تعتمد على بيانات فعلية من مشاريع السعودية في مختلف المناطق.
- قلة استخدام أدوات التحليل الكمي في قياس تأثير العوامل على النجاح العملي للمشاريع .
- عدم توفير توصيات واضحة وقابلة للتطبيق يمكن أن يستفيد منها مدراء المشاريع في بيئة البناء المحلي.

السؤال الرئيسي للدراسة:

ما هي العوامل الإدارية والمالية والبشرية التي تؤثر على نجاح المشاريع في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية ومدى تأثير كل منها؟

أهمية الدراسة

على المستوى النظري:

- تساهم الدراسة في سد الفجوة النظرية من خلال تقديم إطار علمي متكامل يوضح العلاقة بين العوامل المؤثرة ونجاح المشروع.
- تضيف الأدبيات من خلال تطبيق النموذج في سياق محلي يعكس الواقع السعودي مما يساعد على تطوير نماذج نظرية أكثر دقة ملائمة.

على المستوى التطبيقي:

- توفر نتائج البحث بيانات موثوقة يمكن لصناع القرار الاعتماد عليها لتحسين استراتيجيات تنفيذ المشاريع .
- تساعد مديرية المشاريع والمخططين في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو العوامل الأكثر تأثيراً في النجاح .
- تقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق تساهم في رفع جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع في قطاع البناء.

أسئلة الدراسة:

1. ما هي العوامل التنظيمية التي تؤثر على نجاح المشاريع في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية ؟
2. ما دور المهارات الإدارية وألّيا زجة لمديرية المشاريع في تحسين نتائج المشاريع الإنشائية ؟
3. كيف تؤثر جودة التخطيط وإدارة الوقت على نجاح المشاريع في قطاع البناء؟
4. ما مدى تأثير الدعم المالي والموارد المتاحة على تحقيق أهداف المشروع؟
5. هل تختلف العوامل المؤثرة على نجاح المشاريع باختلاف نوع المشروع أو حجمه؟

أهداف الدراسة:

1. تحديد أبرز العوامل التي تساهم في نجاح المشاريع في القطاع صناعة البناء في المملكة العربية السعودية.
2. تحليل العلاقة بين المهارات القيادية لمديرية المشاريع ونتائج المشاريع .
3. تقييم أثر جودة التخطيط وإدارة الوقت في تنفيذ المشاريع.
4. دراسة مدى تأثير الدعم المالي والموارد على أداء المشاريع .
5. تقديم توصيات تساهم في تعزيز فرص نجاح المشاريع المستقبلية في القطاع.

فرضيات الدراسة:

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التخطيط وإدارة الوقت وبين نجاح المشاريع في قطاع البناء.
2. تؤثر المهارات الإدارية والقيادية لمديرية المشاريع بشكل إيجابي على نجاح المشاريع كلما زادت الموارد المالية والبشرية المتاحة زادت احتمالية نجاح المشروع .
3. تختلف العوامل المؤثرة على نجاح المشاريع باختلاف نوع المشروع وحجمه.

نموذج الدراسة:


المتغيرات المستقلة (العوامل مؤثرة):

1. العوامل التنظيمية.
 - . وضوح الأدوار والمسؤولية
 - . هيكل التنظيمي
2. المهارات القيادية لمديرية المشروع
 - . اتخاذ القرار
 - . القدرة على التحفيز والتواصل
3. إدارة الوقت والتخطيط
 - . إعداد الجداول الزمنية
 - . توزيع المهام بدقة
4. الدعم المالي وتوفير الموارد
 - . الميزانية المخصصة
 - . توفير الأدوات والعمالة

المتغير التابع (النتيجة):

- . الالتزام بجدول الزمني
- . الالتزام بميزانية
- . تحقيق جودة العمل المطلوبة

الرسم التخطيطي:

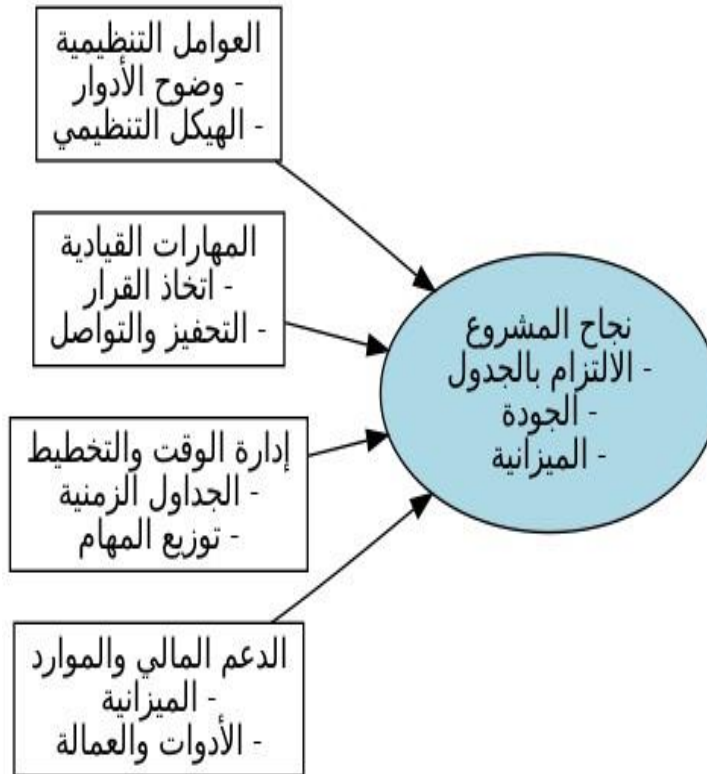


منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصف التحليلي حيث يتم جمع البيانات من الوقائع الميدانية لمشاريع البناء ثم تحليلها لفهم أكثر العوامل المختلفة على نجاح المشروع سيتم استخدام الاستمارة كأداة رئيسية لجمع البيانات في عين من مديرية المشاريع والمهندسين والمشرفين التنفيذيين العاملين في المشاريع بناء السعودية. وسيتم اختيار العينة باستخدام أسلوب العين العشوائية البسيطة لضمان تمثيل عادل للبيئة المستهدفة. بعد جمع البيانات سيتم تحليلها لاستخدام التحليل الإحصائي الوصفي الاستراتيجي مثل (اختبار T وتحليل الانحدار) وذلك لتحديد العلاقة بين المتغير المستقل (العوامل المؤثرة) وألم تغير التابع (نجاح المشروع)


الدراسة الميدانية:


سيتم تطبيق الدراسة ميدانيا على مجموعة من المشاريع القائمة في قطاع البناء داخل المملكة العربية السعودية مع التركيز على مشاريع البناء التجارية والحك كوميه في مدة رئيسية مثل الرياض والدمام وجدة. تم اختيار هذه المدن لاحتوائه على عدد كبير من المشاريع الإنشائية النشطة وتنوع الجهات المنفذة مع بين شركات محلية ودولية سيتم جمع البيانات مع مديرية المشاريع المهندسين والمشرفين التنفيذيين في مواقع المشاريع وذلك لضمان تنوع وجهات النظر وتغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية بشكل شامل .


مخطط المشروع :

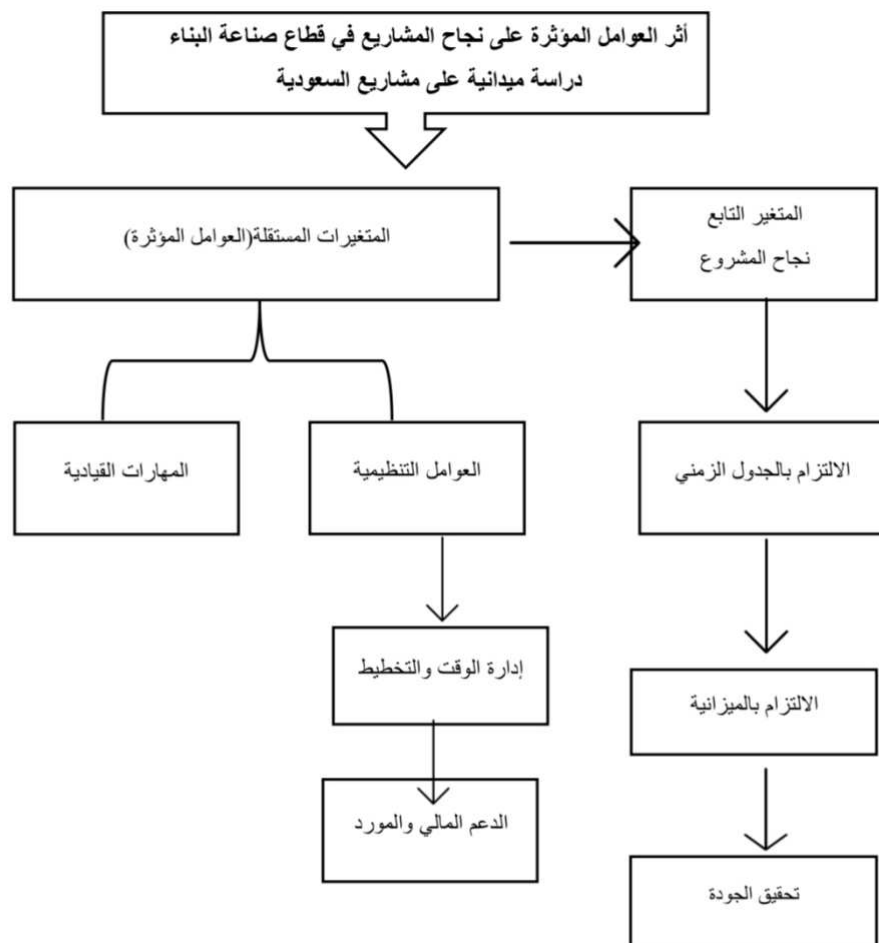



الفصل الثاني









































قائمة المراجع

أب و ناصر، خالد (2019). إدارة المشاريع ع: الأسس والتطبيقات العملية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع

(. العتي ب، فه د2022تحليل أسباب تع ث مشاريع ع البناء ف السعودية. مجلة العلوم الإدارية (، 34)2، 45-66
الاقتصادية. Turner, J. R. (2016). Gower Handbook of Project Management)5th ed.(. Routledge.

Alzahrani, J. I., & Emsley, M. W. (2013). The impact of contractors' attributes on construction project success: A post construction evaluation. International Journal of Project Management, 31(2), 313–322. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.06.006>

Albogamy, A., Scott, D., & Dawood, N. (2015). Addressing construction delays in the Kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Civil Engineering, 13(2), 145–156.

Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling)12th ed.(. Wiley.

Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia.)n.d.(. Vision Realization Programs. Retrieved from <https://www.vision2030.gov.sa>

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

المقدمة

1. التمهيد:

يعد قطاع صناعة البناء من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لما له من دور مباشر في دعم التنمية العمرانية وتوسيع البنية التحتية ويشهد هذا القطاع توسع ملحوظا ضمن رؤية المملكة 2030، مما يتطلب تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية عالية. ومع هذا النمو المتسارع، تزداد الحاجة إلى دراسة العوامل التي تضمن نجاح المشاريع وتقلل من نسب الفشل أو التعثر.

2. مشكلة البحث:

على الرغم من التطور في تقنيات وأساليب تنفيذ المشاريع، إلا أن نسبة كبيرة من مشاريع البناء لا تحقق أهدافها المرجوة من حيث الوقت أو التكلفة أو الجودة. هذا يشير إلى وجود فجوة معرفية في فهم وتحليل العوامل التي تؤثر فعليا على نجاح المشاريع في بيئة البناء السعودية، مما يستدعي البحث في تلك العوامل ومقدار تأثيرها.

3. أهمية البحث:

تبرز أهمية هذه الدراسة في مساهمتها بتقديم معرفة علمية وميدانية تساعد أصحاب القرار ومديري المشاريع في قطاع البناء على تحديد العناصر الأساسية التي يجب التركيز عليها لرفع في نجاح المشروع. كما تدعم الدراسة تحسني ممارسات إدارة المشاريع بما ينسجم تطلعات التنمية الوطنية.

4. أهداف البحث:

- تحديد أبرز العوامل الإدارية والمالية والبشرية المؤثرة على نجاح مشاريع البناء.

- قياس أثر تلك العوامل على أداء العام للمشروع.
- تقديم توصيات قابلة للتطبيق لتحسين إدارة مشاريع البناء في المملكة.

5. منهجية البحث:

يعتمد البحث عن المنهج الكمي باستخدام أداة الأستبانة لجمع البيانات من عينة من العاملين في قطاع البناء مشاريع مهندسين إداريين وقد تم تصميم الاستبانة لقياس أثر العوامل المختلفة على نجاح المشاريع ثم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية لاستخلاص النتائج.

مشكلة الدراسة

بعد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية من أكثر القطاعات نشاطاً ونمواً ومع ذلك، لا تزال العديد من المشاريع تعاني من تحديات تؤثر على نجاحها، مثل التأخير، وتجاوز التكاليف، وضعف الجودة. وتشير التقارير إلى أن بعضها هذه التحديات تعود إلى عوامل إدارية أو مالية أو بشرية، ولكن مازال هناك نقص في الفهم العميق لهذه العوامل وأثرها الفعلي على نجاح المشاريع، خاصة في السياق السعودي. ولهذا تطرح مشكلة البحث في ضوء الفجوات التالية:

فجوات على المستوى النظري:

قلة الدراسات الحديثة التي تدمج بين العوامل الإدارية والمالية والموارد البشرية ضمن نموذج شامل يوضع علاقتها بنجاح المشاريع. محدودية النماذج النظرية التي تم اختيارها في بيئة البناء السعودية ما اعتمد بعض الدراسات على إطار أجنبية قد لا تعكس الواقع المحلي. تباين التعريفات والمفاهيم المستخدمة لمفهوم نجاح المشروع مما يؤثر على دقة القياس والتحليل في الدراسات السابقة.

فجوات على المستوى التطبيقي:

- غياب الدراسات الميدانية التي تعتمد على بيانات فعلية من مشاريع السعودية في مختلف المناطق.
- قلة استخدام أدوات التحليل الكمي في قياس تأثير العوامل على النجاح العملي للمشاريع.
- عدم توفير توصيات واضحة وقابلة للتطبيق يمكن أن يستفيد منها مدراء المشاريع في بيئة البناء المحلي.

السؤال الرئيسي للدراسة:

ما هي العوامل الإدارية والمالية والبشرية التي تؤثر على نجاح المشاريع في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية ومدى تأثير كل منها؟


أهمية الدراسة


على المستوى النظري:


- تساهم الدراسة في سد الفجوة النظرية من خلال تقديم إطار علمي متكامل يوضح العلاقة بين العوامل المؤثرة ونجاح المشروع.
- تضيق الأدبيات من خلال تطبيق النموذج في سياق محلي يعكس الواقع السعودي مما يساعد على تطوير نماذج نظرية أكثر دقة ملائمة.


على المستوى التطبيقي:


- توفر نتائج البحث بيانات موثوقة يمكن لصناع القرار الاعتماد عليها لتحسين استراتيجيات تنفيذ المشاريع.
- تساعد مديرية المشاريع والمخططين في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو العوامل الأكثر تأثيراً في النجاح.
- تقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق تساهم في رفع جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع في قطاع البناء.















































قائمة المراجع

- أ.ب و ناصر، خال د. (2019). إدارة المشاريع ع: الأسس والتطبيقات العملية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع ع
- (. تحليل أسباب تعثر مشاريع البناء في السعودية. مجلة العلوم الإدارية 2022 العتي ب، فه د. ، 34)2 ، 45-66
- الاقتصادية. Turner, J. R. (2016). Gower Handbook of Project Management (5th ed.). Routledge.
- Alzahrani, J. I., & Emsley, M. W. (2013). The impact of contractors' attributes on construction project success: A post construction evaluation. International Journal of Project Management, 31(2), 313–322. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.06.006>
- Albogamy, A., Scott, D., & Dawood, N. (2015). Addressing construction delays in the Kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Civil Engineering, 13(2), 145–156.
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Wiley.
- Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. (n.d.). Vision Realization Programs. Retrieved from <https://www.vision2030.gov.sa>
