

Final Project 2

PMG 497

نموذج المشروع النهائي 2

عنوان المشروع

أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع في شركة STC بمدينة الرياض

أسم الطالب

منيره فهد المغيربي

232000356

المشروع النهائي- 2

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

عبد الرحيم نادر د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي

الشكر والتقدير

الحمد لله الذي أعانني بفضلِهِ وتوفيقِهِ على إتمام هذا البحث، والصالة والسلام على خير الأنام، وبعد.. فإنه من دواعي سروري وفخري أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صرحي العلمي الشامخ "جامعة ميداووشن" (University Midocean)، هذه الجامعة التي وفرت لنا بيئة تعليمية رائدة ومنصات معرفية متميزة ساهمت في صقل مهارتنا وتوسيع آفاقنا العلمية.

أخص بالشكر إدارة الجامعة وأساتذتي الكرام في كلية الإدارة، الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم وتوجيهاتهم السديدة طوال مسيرتنا الدراسية. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة المشرف على هذا البحث، الذي كان لتوجيهاته القيمة وما لحظاته الدقيقة أثر كبير في تجويد هذا العمل وخروجه بالصورة المطلوبة.

والشكر موصول لشركة stc وكافة منسوبيها الذين أتاحوا لي فرصة البحث والتقصي، وللمشاركين في عينة الدراسة الذين خصصوا من وقتهم الإجابة على التساؤلات، فلوال تعاونهم لما اكتملت جوانب هذا البحث التطبيقية. في صرح العلم والم ختاماً عرفة، ومنارةً لمن، أسأل هلالا العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يكون لبنَةً يبتغي الفائدة

الإهداء

إلى من كللها الله بالهيبة والوقار... إلى من أحمل اسمهما بكل فخر... إلى من كانت دع إلى من كل لنجاحي، واتهما سرّاً في كل خطوة خطوتها... (والدي العزيز) و(والدة الغالية)، أطل هلاً في وسندا عمركما وجزاكما عني خيراً الجزاء، إليكما أهدي هذا العمل المتواضع ثمرةً لغرسكما الذي رعيتموه بالحب والدعاء

إلى إخوتي وأخواتي، ومن شاركوني لحظات التعب والاجتهاد، وكانوا لي عوناً ودافعاً للاستمرار... إليكم جميعاً أهدى نجاحاً

إلى كل من علمني حرفاً، وبصرني درباً آمنوا بقدراتي حينما شككتُ فيها وشجعوني على مضي قدماً نحو تحقيق طموحي... إليكم جميعاً يمتد شكري وامتناني

مستخلص الدراسة

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتقييم أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO) في تحقيق نجاح المشاريع المنفذة بشركة الاتصالات السعودية (stc)

المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبيان لجمع البيانات واستهداف عينة عشوائية مكونة من (29) موظفاً ومشاركاً من العاملين في مجال إدارة المشاريع بشركة (stc) وتمت

معالجة البيانات إحصائياً باستخدام التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، واختبار الانحدار الخطي البسيط.

النتائج: أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لمكتب إدارة المشاريع (PMO) في نجاح المشاريع؛ حيث بلغ معامل الارتباط ($R = 0.685$) ومعامل التحديد ($R^2 = 0.469$)، مما يعني أن الـ PMO يفسر ما نسبته (46.9%) من التغير الإيجابي الحاصل في نجاح المشاريع بالشركة وجود علاقة علاقة إيجابية بين فعالية PMO ونجاح المشروع

التطبيقات والأهمية: تكمن أهمية الدراسة في تقديم توصيات عملية لشركة (stc) والقطاعات المماثلة لتعزيز صلاحيات مكاتب إدارة المشاريع وتوفير الأدوات الرقمية لرفع كفاءة التخطيط وتقليل الانحرافات الزمنية والمالية.

الكلمات المفتاحية: مكتب إدارة المشاريع (PMO)، نجاح المشاريع، شركة (stc)، الانحدار الخطي، المواءمة الاستراتيجية.

جدول المحتويات

2	الشكر والتقدير.....
3	الإهداء.....
3	مستخلص الدراسة.....
7	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.....
8	1.1. المقدمة:.....
9	1.2. مشكلة الدراسة.....
9	1.2.1. فجوات على المستوى النظري.....
9	1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي.....
10	1.3. أهمية الدراسة.....
10	1.3.1. على المستوى النظري:.....

10.....	1.3.2. على المستوى التطبيقي:
11.....	1.4. أسئلة الدراسة
11.....	1.5. أهداف الدراسة
12.....	1.6. فرضيات الدراسة
12.....	1.7. نموذج الدراسة
13.....	1.8. الدراسة الميدانية
14.....	1.9. مخطط المشروع
16.....	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة
17.....	2.1. المقدمة
17.....	2.2. المتغير المستقل
18.....	2.3. المتغير التابع
21.....	2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
22.....	2.5. الخاتمة
25.....	3. الفصل الثالث: منهجية الدراسة
26.....	3.1. المقدمة
26.....	3.2. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث
27.....	3.3. تصميم البحث
27.....	3.4. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات
28.....	3.5. طريقة جمع البيانات
28.....	3.6. أنواع البيانات
28.....	3.7. إجراءات التحليل الإحصائي
28.....	3.8. الخاتمة
30.....	4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج
31.....	4.1. المقدمة
31.....	4.2. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)
32.....	4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات
33.....	4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)
34.....	4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
35.....	4.6. الخاتمة
36.....	5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات
37.....	5.1. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

38.....	5.2.توصيات الدراسة:
38.....	5.3.الخاتمة:
39.....	قائمة المراجع.
42.....	الملاحق.

جدول الأشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل	رقم الصفحة
(3-1)	مخطط تصميم البحث(بصلة البحث)	29

جدول الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	رقم الصفحة
(1.1)	نموذج الدراسات والإبعاد والتغيرات	13
(2.1)	تلخيص ومقارنة الدراسات السابقة حول علاقة المتغيرات	22
(1.2)	ملخص الدراسات السابقة	23
(4.1)	توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الشخصية (الجنس – العمر)	31
(4.2)	توزيع أفراد العينة حسب المؤهل وسنوات الخبرة	32
(4.3)	الإحصاء الوصفي لمتغيرين	33

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
35	نتائج اختبار الانحدار الخطي البسيط لاختبار فرضية الدراسة	(4.5)

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة:

شهدت المؤسسات المعاصرة توسعاً كبيراً في استخدام إدارة المشاريع كأداة استراتيجية لتحقيق أهدافها التنظيمية، خاصة في البيئات التنافسية التي تتطلب سرعة في الإنجاز وكفاءة في استخدام الموارد. وقد أصبح وجود مكتب إدارة المشاريع (PMO) (عنصرًا أساسيًا لدعم حوكمة المشاريع وتوحيد منهجيات العمل داخل المؤسسات، حيث يساهم في تحسين التخطيط والمتابعة وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع وكذلك تعزيز التنسيق بين الفرق المختلفة وتقليل المخاطر المحتملة

تُعد فعالية مكتب إدارة المشاريع من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على نجاح المشاريع، إذ يساعد المكتب في تعزيز التنسيق بين الفرق، وضبط الجودة، وضمان الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددة. وتشير الدراسات إلى أن المؤسسات التي تطبق أنظمة PMO فعالة تحقق معدلات نجاح أعلى مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى هذا التنظيم الإداري حيث يساهم في توحيد الإجراءات، وضع السياسات، إدارة المخاطر، وتحسين استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل. ومع تزايد المنافسة في سوق الاتصالات، أصبحت الشركات بحاجة إلى تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق

علاوة على ذلك، يساهم مكتب إدارة المشاريع في تطوير القدرات المؤسسية من توفّر خلال ير أطر تنظيمية واضحة وإجراءات قياسية لإدارة المشاريع، مما يرفع من مستوى النضج الإداري داخل المؤسسة. وقد أكدت عدة دراسات أن وجود PMO منظم يعزز الأداء الاستراتيجي ويزيد من كفاءة تنفيذ المشاريع طويل المدى

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين الإطار النظري لتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتطبيق العملي داخل المؤسسات، حيث تواجه بعض الشركات صعوبات في تحقيق الاستفادة القصوى من هذا النظام بسبب ضعف التكامل أو غياب التقييم المستمر الأداء

من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتحليل أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع في شركة STC بمدينة الرياض، باعتبارها من المؤسسات الرائدة في قطاع الاتصالات، وذلك لفهم العلاقة بين البنية التنظيمية لإدارة المشاريع ومستوى نجاحها في الواقع التطبيقي

1.2. مشكلة الدراسة

على الرغم من انتشار مكاتب إدارة المشاريع داخل المؤسسات الحديثة، إلا أن مستوى نجاح المشاريع ال يزال متفاوتاً بين الشركات، مما يشير إلى وجود خلل في فعالية تطبيق أنظمة PMO. فبعض المؤسسات تمتلك هيكل تنظيمياً رسمياً لإدارة المشاريع، لكنها لا تحقق النتائج المتوقعة من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة هذه المكاتب في الواقع العملي

1.2.1. فجوات على المستوى النظري

تشير الادبيات العلمية إلى اختلاف في نماذج تقييم فعالية مكاتب إدارة المشاريع، حيث ال يوجد إطار موحد لقياس تأثير PMO على نجاح المشاريع. كما أن الدراسات السابقة ركزت على الجوانب التنظيمية دون الربط الكافي بين الأداء الفعلي للمشاريع وفعالية المكتب الإداري ، مما يخلق فجوة معرفية تستدعي المزيد من البحث بالإضافة إلى ذلك، هناك تفاوت في المعايير المستخدمة بين الباحثين والممارسين، إذ تختلف مؤشرات الأداء بين التركيز على الالتزام بالوقت والميزانية أو على جودة المخرجات أو رضا أصحاب المصلحة. كما لم تتناول معظم الدراسات تأثير الثقافة التنظيمية، خبرة الفريق، ومدى تكامل PMO مع الإدارات الأخرى ، وهي عوامل قد تلعب دوراً حاسماً في نجاح المشاريع. علاوة على ذلك، هناك قلة من الدراسات التي تتناول السياق المحلي للشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تختلف بيئة العمل والموارد و الاجراءات عن السياقات الدولية، مما يجعل الحاجة لدراسة ميدانية مستمرة أمراً ضرورياً لفهم العلاقة الحقيقية بين فعالية PMO ونجاح المشاريع في بيئة محلية معقدة ومتغيرة

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي

على المستوى التطبيقي، تواجه المؤسسات تحديات في مواءمة مكاتب إدارة المشاريع مع أهدافها الاستراتيجية، وقد يؤدي ضعف التكامل بين الإدارات إلى تقليل الاستفادة من وجود PMO. كما أن بعض الشركات ال تمتلك أدوات تقييم مستمرة لقياس نجاح المشاريع، مما يحد من قدرتها على تطوير الأداء المؤسسي واتخاذ قرارات تصحيحية في الوقت المناسب. إضافة إلى ذلك، تواجه المؤسسات صعوبات في توظيف الكفاءات المناسبة داخل PMO، حيث أن غياب التدريب المستمر والمهارات التقنية و الإدارية المتخصصة يؤدي إلى انخفاض فعالية المكتب في متابعة ومراقبة تقدم المشاريع. كما تلعب قيود الموارد والميزانيات المحدودة دوراً في تقليل قدرة PMO على تطبيق أفضل الممارسات، مما يؤثر على جودة المشاريع النهائية. علاوة على ذلك، غالباً ما يفتقر المكتب إلى أنظمة معلومات متكاملة لمتابعة المشاريع، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث تأخيرات أو تجاوز الميزانية، ويجعل قياس تأثير PMO على نجاح

المشاريع أكثر صعوبة. ينتهي هذا الجزء بالسؤال الرئيسي ما أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع في شركة STC بمدينة الرياض؟

1.3. أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الدور المحوري الذي تلعبه إدارة المشاريع في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الحديثة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية إذ تساعد إدارة المشاريع الفعالة على تحسين تخطيط وتنفيذ المشاريع، وتقليل المخاطر المحتملة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة أعلى كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على العلاقة بين فعالية مكتب إدارة المشاريع ونجاح المشاريع، وهو جانب بالغ الأهمية لكل من الباحثين والممارسين في مجال إدارة المشاريع، حيث توفر معرفة نظرية وعملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج الدراسة تساعد المؤسسات على تحديد نقاط القوة، واتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي، بما يضمن التزام المشاريع PMO والضعف في الوقت والميزانية والجودة من ناحية أخرى، تعود أهمية هذه الدراسة أيضاً إلى دعم صناع القرار في الشركة، حيث تمكنهم من وضع خطط تطويرية مستندة إلى بيانات دقيقة ونتائج عملية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة إدارة المشاريع بين الموظفين وتدريبهم على أفضل الممارسات. كما يمكن أن تكون الدراسة مرجعاً مهمًا للمؤسسات المماثلة التي تسعى لتحسين نظم إدارة المشاريع لديها وتحقيق التميز المؤسسي في بيئة عمل تنافسية ومتغيرة

على المستوى النظري:

تساهم الدراسة في تطوير المعرفة العلمية المتعلقة بفعالية مكاتب إدارة المشاريع، كما تضيف إطاراً تحليلياً يساعد الباحثين على فهم العلاقة بين النظم الإدارية ونجاح المشاريع، مما يدعم الأدبيات في مجال الإدارة ونجاح المشاريع، مما يدعم الأدبيات في مجال الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تملأ هذه الدراسة فجوات البحث المختلفة على الأداء الفعلي للمشاريع، بما PMO السابقة من خلال تقديم تحليل موسع لكيفية تأثير ممارسات يشمل الالتزام بالوقت، الميزانية، وجودة المخرجات كما توفر الدراسة قاعدة معرفية يمكن للباحثين استخدامها لمقارنة التجارب الدولية والمحلية، وتحليل مدى قابلية تطبيق النماذج المختلفة الإدارة المشاريع في بيئات مختلفة. عالوة على ذلك، تساعد النتائج على تطوير بشكل أكثر دقة وشمولية، وتدعم الدراسات المستقبلية التي تهدف إلى دمج PMO نماذج قياس فعالية العوامل التنظيمية، التقنية، والثقافية في تقييم نجاح المشاريع. من خلال هذه الإضافة، يمكن للباحثين فهم العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي بشكل أعمق، وهو ما يثري الأدبيات العلمية وينتج فرصاً لدراسات تطبيقية جديدة في المؤسسات

1.3.1. على المستوى التطبيقي:

في تحسين أداء مكاتب إدارة STC توفر الدراسة نتائج عملية يمكن أن تساعد المؤسسات، ومنها شركة المشاريع وتطوير سياسات تنفيذ المشاريع، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات وتقليل المخاطر، PMO التشغيلية كما تساهم الدراسة في تقديم توصيات عملية لإعادة تصميم العمليات والإجراءات داخلها. بما يضمن تكاملها مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بالإضافة إلى ذلك، تساعد نتائج الدراسة على تطوير أدوات تقييم دورية لمراقبة أداء المشاريع، وتمكين

الإدارة من اتخاذ قرارات تصحيحية سريعة في حال وجود أي انحراف عن المخطط. كما تتيح النتائج تصميم برامج تدريبية متخصصة للموظفين لتحسين مهاراتهم في إدارة المشاريع، مما يزيد من كفاءة فرق العمل. ويعزز من قدرة المؤسسة على إنجاز المشاريع ضمن الوقت والميزانية المحددين علاوة على ذلك، توفر الدراسة نموذجاً عملياً يمكن تطبيقه في مؤسسات مشابهة، بما يساهم في نشر أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستدام. هذه الفوائد تجعل من نتائج البحث أداة قيمة لصناع القرار في تحسين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وتقليل احتمالية الفشل في المشاريع. المستقبلية، وضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة أعلى

1.4. أسئلة الدراسة

- 1: إلى أي مدى تؤثر فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO) على نجاح تنفيذ المشاريع داخل الشركة محل الدراسة؟ .
- 2: كيف تساهم ممارسات مكتب إدارة المشاريع في تحسين جودة إدارة المشاريع؟ .
- 3: ما العلاقة بين فعالية مكتب إدارة المشاريع ومستوى الأداء المؤسسي؟
- 4: ما التحديات التي تحد من فعالية مكتب إدارة المشاريع داخل المؤسسة؟
- 5: كيف يمكن تصميم آليات تقييم دورية لقياس تأثير PMO على نجاح المشاريع بشكل مستمر وموضوعي؟
- 6: ما دور ثقافة العمل المؤسسية والخبرة التقنية للموظفين في تعزيز فعالية مكتب إدارة المشاريع وتحقيق نتائج أفضل؟ .
- 7: ما التوصيات العملية التي يمكن اقتراحها لتعزيز أداء (POM) وتحسين نتائج المشاريع في المستقبل؟

1.5. أهداف الدراسة

- 1: دراسة تأثير فعالية مكتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع
- 2: التعرف على دور مكتب إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي
- 3: تقييم مستوى فعالية مكتب إدارة المشاريع في الشركة محل الدراسة
- 4: اقتراح آليات لتطوير أداء مكتب إدارة المشاريع

5:توليد رؤى تساعد في تحسين ممارسات إدارة المشاريع

6:تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على فعالية (PMO) مثل الثقافة التنظيمية مهارات الفريق ومواءمة الأهداف مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة

7:دعم عملية اتخاذ القرار الإداري من خلال توفير بيانات دقيقة وتوصيات مستندة الى نتائج الدراسة مما يساعد على تحسين استدامة نجاح المشاريع وتقليل المخاطر التشغيلية

1.6. فرضيات الدراسة

H1الفرضية الصفرية):

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لفعالية مكتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع.

(H2الفرضية البديلة):

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لفعالية مكتب إدارة المشاريع على نجاح المشاريع.

(H3الفرضية الاتجاهية):

كلما زادت فعالية مكتب إدارة المشاريع زاد نجاح المشاريع.

(H4الفرضية غير الاتجاهية):

توجد علاقة بين فعالية مكتب إدارة المشاريع ونجاح المشاريع دون تحديد اتجاه العلاقة.

1.7 نموذج الدراسة

المتغير المستقل	الابعاد الرئيسية	المتغير التابع	النتيجة المتوقعة
-----------------	------------------	----------------	------------------

مكتب إدارة المشاريع (PMO)	التخطيط والرقابة والحوكمة	نجاح المشاريع	الالتزام بالوقت والميزانية وجودة المخرجات
------------------------------	------------------------------	---------------	---

1.7. الدراسة الميدانية

أظهرت العديد من الدراسات الميدانية أن وجود مكتب إدارة مشاريع فعال يسهم كبير في تحسين نسب نجاح تحقق PMO المشاريع وتقليل معدلات الفشل. وأكدت دراسات أخرى أن المؤسسات التي تطبق ممارسات مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والرقابة على التكاليف بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتحسين إدارة المخاطر المحتملة في المشاريع كما أظهرت بعض النتائج الميدانية أن الشركات التي تعتمد على مكاتب إدارة مشاريع متكاملة تتمتع بقدرة أكبر على التكيف مع التغيرات الطارئة في بيئة العمل، سواء كانت تقنية أو اقتصادية، وتتمكن من إعادة يوفر آليات PMO ترتيب أولويات المشاريع بشكل أسرع وأكثر فعالية. وتشير الدراسات إلى أن وجود واضحة للمتابعة والتقييم الدوري للمشاريع، مما يسمح بالكشف المبكر عن الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل تفاقم المشكلات ، من خلال PMO

علاوة على ذلك، أثبتت الدراسات الميدانية أن الاستثمار في تطوير قدرات وكفاءات فرق التدريب والتطوير المستمر، يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي بشكل عام، ويزيد من قدرة المؤسسة على تنفيذ في ثقافة العمل PMO المشاريع الاستراتيجية بنجاح. كما أن هذه الممارسات الميدانية تؤكد على أهمية دمج المؤسسية لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المتبعة، مما يؤدي إلى تحقيق استدامة في تحسين جودة المشاريع وتقليل المخاطر التشغيلية على المدى الطويل

1.8. مخطط المشروع

الافصل الأول مقدمة ومشكلة الدراسة

خلفية الدراسة

مشكلة البحث

الفجوات النظرية و التطبيقية

اهداف البحث

أسئلة البحث-أهمية الدراسة

الفصل الثاني مراجعة الادبيات

الدراسات السابقة المتعلقة ب PMO ونجاح المشاريع

الفجوات في الادبيات

النماذج النظرية المستخدمة في التقييم PM

الفصل الثالث منهجية الدراسة

فلسفة البحث والمنهج

استراتيجية البحث ونوعية

الأفق الزمني

أدوات جمع البيانات (استبيانات و وثائق ان وجدت)

الفصل الرابع التحليل ومناقشة النتائج

عرض النتائج الاحصائية للمسح الميداني

مناقشة العالقة بين فعالية PMO ونجاح المشاريع

تفسير النتائج وربطها بالدراسات السابقة

الفصل الخامس النتائج والتوصيات

استخلاص الاستنتاجات الأساسية

التوصيات العملية للشركة والمؤسسات المماثلة

اقتراحات للدراسات المستقبلية

اهم النتائج	المنهج المستخدم	هدف الدراسة	الباحث والسنة
الـ PMO يحسن كفاءة المشاريع ويقلل الفشل.	الوصفي التحليلي	تحليل دور الـ PMO في الاداء التنظيمي	Aubry et al. (2007)
الحوكمة تحسن اتخاذ القرار وتقلل المخاطر	الوصفي التحليلي	أثر حوكمة المشاريع على النجاح	Too & Weaver (2014)
ممارسات الـ PMO ترفع معدلات النجاح و الالتزام	الوصفي التحليلي	تقييم ممارسات الـ PMO الحديثة	Kerzner (2019)
وجود علاقة مباشرة بين المنهجية و تحقيق الاهداف	الوصفي الارتباطي	العلاقة بين المنهجيات والنجاح	Joslin & Müller (2015)

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

تعد مراجعة الإديبات العلمية حجر الزاوية في البحث الأكاديمي الرصين، فهي تمثل المرجعية النظرية التي يستند إليها الباحث لفهم الجذور التاريخية للمفاهيم المدروسة، وتتبع تطورها عبر الزمن. إن استعراض الدراسات السابقة ليس مجرد جرد للمعلومات، بل هو أداة تحليلية تتيح للباحث تحديد الفجوات المعرفية التي لم تغطيها البحوث السابقة، مما يمهد الطريق لتقديم مساهمة بحثية جديدة تتوافق مع التطورات الإدارية المعاصرة

يهدف هذا الفصل إلى استعراض المرتكزات النظرية والأدبية لمتغيري الدراسة الأساسيين؛ حيث سيتم تناول "فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO)" (كمتغير مستقل، وتحليل أبعاده ودوره في حوكمة العمليات المؤسسية. كما سيتم استعراض مفهوم "نجاح المشاريع" كمغير تابع، مع التركيز على المعايير الحديثة لقياس النجاح التي تتجاوز النظرة التقليدية، لتشمل القيمة الاستراتيجية المضافة للمنظمة

وعلاوة على ذلك، سيسلط هذا الفصل الضوء على النظريات المفسرة العلاقة الارتباطية بين هذين المتغيرين، مع مراعاة الخصوصية التنظيمية لبيئة العمل في قطاع الاتصالات السعودي، وبالأخص شركة stc بمدينة الرياض. إن بناء هذا الإطار المفاهيمي المتكامل يهدف إلى خلق أرضية صلبة تساعد في تفسير النتائج الميدانية التي سيخلص وربطها بالواقع العملي لمشاريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

2.2. المتغير المستقل

يُعرف مكتب إدارة المشاريع (PMO) بأنه وحدة تنظيمية داخل المؤسسة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المشاريع من خلال توحيد المعايير والإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لفرق العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف المشاريع بكفاءة عالية

(فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO) -

1 مفهوم مكتب إدارة المشاريع وتطوره: لم يعد مكتب إدارة المشاريع مجرد وحدة إدارية لمراقبة الجداول الزمنية، بل تطور ليصبح ش في المنظمات الكبرى. في شركة مثل استراتيجية stc ، يمثل المكتب (PMO) المركز العصبي الذي يضمن محاذاة المشاريع التقنية والإنشائية مع استراتيجية الشركة "تجراً - "DARE". الفعالية هنا ال تعني الوجود التنظيمي فحسب، بل القدرة على تقديم قيمة مضافة-Add) Value من خلال تحسين استغلال الموارد وتقليل المخاطر

التطوير التاريخي: كأداة تنظيمية بسيطة تركز على متابعة المشاريع، ثم تطور ليصبح عنصر استراتيجي يا PMO بدأ مفهوم أكثر أهمية في إدارة PMO يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة. ومع زيادة تعقيد المشاريع، أصبح دور الموارد وتحقيق التكامل بين المشاريع

أبعاد الرئيسية لفعالية الـ PMO: تتحدد فعالية المكتب من خلال عدة أبعاد جوهرية أجمعت عليها الدراسات السابقة، ومن أهمها

الحوكمة والإشراف: وضع المعايير والسياسات التي تضمن انضباط العمل.

تطوير المنهجيات: اعتماد أساليب رشيقة (Agile) أو (تقليدية) (Waterfall) (تناسب طبيعة مشاريع الاتصالات

إدارة المعرفة: العمل كخزان للدروس المستفادة (Learned Lessons) (لمنع تكرار أخطاء المشاريع السابقة

• التخطيط الاستراتيجي

• الرقابة والمتابعة

إدارة المخاطر

• دعم اتخاذ القرار

التواصل التنظيمي

وتلعب هذه الأبعاد دوراً مهماً في تحسين أداء المشاريع داخل المؤسسات أوال :أنواع المكاتب إدارة المشاريع :

لا تتشابه مكاتب إدارة المشاريع في هيكليتها وصالحيتها ، بل تتنوع بنا المنظمة ومستوى على احتياجات (النضج الإداري فيها. ووفقاً 2021 (Institute Management Project, يمكن تصنيف هذه المكاتب إلى ثلاثة أنواع رئيسية تختلف في درجة السيطرة والتأثير

1: المكتب الداعم (PMO Supportive) (يقتصر دور هذا النوع على كونه مستودعاً للمعلومات و الدروس المستفادة، حيث يقدم الدعم الاستشاري والنماذج الجاهزة لمدرء المشاريع دون التدخل المباشر في الإدارة ، وتكون سلطته في شركة stc هنا استشارية تهدف لتعزيز الثقافة المعرفية.

2: المكتب المتحكم (PMO Controlling) يتجاوز دور الدعم ليشمل فرض الامتثال للمعايير والمنهجيات المعتمدة. يتطلب هذا النوع من مدرء المشاريع اتباع أطر عمل محددة واستخدام أدوات تقنية معينة، لضمان جودة المخرجات. ويمارس دوراً رقابي

3: المكتب التوجيهي (PMO Directive) (وهو النوع أكثر قوة، حيث يتولى المكتب إدارة المشاريع بشكل لمكتب مباشر. مدرء المشاريع في هذا النوع يتبعون إدارياً PMO ، مما يضمن أعلى مستويات الضبط والحوكمة، وهو النموذج الذي غالباً stc في مشاريع التحول الرقمي الكبرى لضمان سرعة التنفيذ ما تتبناه ودقته

النظرية المرتبطة:

تفسر نظرية الامتيازات القائمة على الموارد (View BASED-RESOURCE) ان مكتب إدارة المشاريع الفعال يعد * موردا نادرا وغير قابل للاستبدال * يوفر لشركة stc ميزة تنافسية من خلال تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة اعلى من المنافسين

يرتبط PMO بعدة نظريات ومنها:

نظرية النظم .

نظرية الحوكمة .

نظرية الإدارة العلمية.

حيث تساهم هذه النظريات في تفسير كيفية تحسين الأداء المؤسسي من خلال تنظيم العمليات الإدارية يحقق ميزة تنافسية وفق نظرية استراتيجية ، يجب أن RBV) ولكي يُعد مكتب إدارة المشاريع موردا لنموذج Barney, 1991): يستوفي أربعة شروط أساسية طبقا من خلال قدرته على تقليل الهدر المالي والزماني stc في PMO تكمن قيمة الـ (Value): القيمة: وتحويل الأهداف الاستراتيجية "تجراً" إلى واقع ملموس. التمكين الرقمي لفعالية مكتب إدارة المشاريع إن وجود مكتب إدارة مشاريع يمتلك كفاءات وطنية حاصلة على شهادات احترافية (Rarity): الندرة هو مورد نادر يمنح الشركة تفوقاً بشرياً (PgMP) و (PMP) مثل عالمية

لا يمكن للمنافسين تقليد ثقافة العمل والخبرة التراكمية لانظمة (Inimitability) صعوبة التقليد. بسهولة، لي انها نتاج سنوات من الممارسة والتطوير stc في PMO التقنية المدمجة داخل الـ على تنظيم هذا stc الميزة لا تأتي من وجود المورد فحسب، بل من قدرة (Organization): التنظيم المكتب وهيكلته بطريقة تضمن تدفق المعلومات وانسيابية القرار بين الإدارة العليا وفرق التنفيذ

تعتمد على النماذج الورقية، بل انتقلت PMO في ظل التحول التقني بمدينة الرياض، لم تعد فعالية الـ " (EPM - Management Project Enterprise) أنظمة متطورة مثل stc إلى 'الامتعة'. تستخدم ، مما يتيح الإدارة مراقبة الأداء لحظيا ، وهذا (Dashboard) لربط كافة المشاريع بلوحة بيانات واحدة & Rad (التمكين التقني هو المحرك الأساسي لرفع مستوى فعالية المتغير المستقل في هذه الدراسة , Levin, 2002)." .

2.3. المتغير التابع

المفهوم الحديث لنجاح المشروع :

تجاوز مفهوم النجاح النظرة الضيقة لـ "المثلث الحديدي" (الوقت، التكلفة، الجودة). في قطاع الاتصالات الرقمي، يقاس النجاح بمدى رضا العميل النهائي، وسرعة طرح الخدمة في السوق (Market to Time)، وتحقيق العائد على الاستثمار (ROI). التطور التاريخي: كان نجاح المشاريع يقاس سابقاً من خلال الالتزام بالوقت وتكلفة فقط إلا أن المفهوم تطور ليشمل جودة النتائج ورضا العملاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية

الابعاد الرئيسية: يُعد نجاح المشاريع مفهوم ما متعدد الأبعاد، حيث لا يقتصر فقط على الالتزام بالوقت والتكلفة، بل يشمل مجموعة من المعايير التي تعكس جودة التنفيذ ورضا أصحاب المصلحة واستدامة النتائج. ومن أهم هذه الأبعاد ما يلي

الالتزام بالوقت: يقصد به قدرة المشروع على الانتهاء ضمن الجدول الزمني المحدد مسبقاً دون تأخير. ويُعتبر هذا البعد من أهم مؤشرات نجاح المشاريع، حيث أن التأخير في التسليم قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل رضا العمال

الالتزام بالتكلفة: يشير إلى مدى التزام المشروع بالميزانية المعتمدة مسبقاً وزيادات مالية. ويعد التحكم في التكاليف من المؤشرات الأساسية لنجاح إدارة المشاريع الفعالة

جودة المخرجات: يعكس هذا البعد مدى مطابقة مخرجات المشروع للمعايير والمواصفات المطلوبة. فحتى لو تم إنجاز المشروع في الوقت والتكلفة المحددين، فإن ضعف الجودة يقلل من نجاحه

رضا أصحاب المشروع: يُقاس نجاح المشروع أيضاً من خلال مدى رضا العملاء وأصحاب المصلحة عن النتائج النهائية. ويشمل ذلك تلبية التوقعات وتحقيق الفائدة المرجوة من المشروع

تحقيق الأهداف الاستراتيجية: يعني مدى مساهمة المشروع في تحقيق أهداف المؤسسة طويلة المدى. فالمشروع الناجح هو الذي يخدم رؤية المؤسسة وليس فقط أهدافه التشغيلية

2.3. الاستدامة و الاستمرارية: وهو بُعد حديث نسبياً، ويقصد به قدرة نتائج المشروع على الاستمرار وتحقيق قيمة طويلة المدى للموسسة

النظرية المرتبطة :

تعتبر هذه النظرية من اهم النظريات المفسرة لنجاح المشاريع الحديثة تفترض النظرية ان نجاح في شركة سي (ال يتوقف فقط على انتهاء العمل في الوقت المحدد بل يعتمد على أصحاب المصلحة (اس تي مثل) الإدارة العليا الموظفين و العملاء في مدنية الرياض(فالمشروع قد يكتمل تقنيا لكن اذا لم يحقق تطلعات المستخدمين او لم يسهل تجربة العميل في اس تي سي فانه يعتبر فاشلا نظرية الأهداف : تشير هذه النظرية إلى أن تحديد أهداف واضحة، محددة، وصعبة (ولكن قابلة للتحقيق) (كضابط لهذه) PMO ، يعمل مكتب إدارة المشاريع stc هو المحرك الأساسي لنجاح أي مشروع. في بيئة الأهداف ، حيث تزداد احتمالية نجاح المشاريع عندما تكون الهدف متوائمة مع استراتيجية الشركة النجاح هنا يُقاس بمدى القرب من تحقيق الهدف الاستراتيجي المرسوم مسبقاً "DAR".

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

(فعالية الـPMO) والمتغير التابع (نجاح المشاريع): تشير مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة إلى وجود علاقة طردية قوية ومباشرة؛ فكلما ارتفعت مستويات نضج وفعالية مكتب إدارة المشاريع، زادت بالتبعية نسب نجاح المشاريع داخل المنظمة. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة ليست مجرد معادلة ثابتة، بل هي عملية ديناميكية تتأثر بظروف البيئة التنظيمية، وهو ما سيتم استعراضه من خلال المحاور التالية :

و اولاً : تحليل طبيعة العالقة الطردية في بيئة stc : إن فعالية المتغير المستقل في شركة stc ال تؤدي إلى النجاح بشكل تلقائي بمجرد وجود المكتب، بل من خلال الدور "التمكيني" الذي يمارسه. فالمكتب يعمل كركيزة أساسية لضمان محاذاة كافة المشاريع التقنية والإنشائية مع استراتيجية الشركة "تجراً DARE" - ، مما يقلل من تشتت الجهود. وتؤكد نظرية أصحاب المصلحة أن قوة هذه العالقة تترسخ عندما ينجح المكتب في موازنة تطلعات الإدارة العليا مع احتياجات الفرق التنفيذية في الميدان بمدينة الرياض، مما يخلق بيئة عمل متناغمة تدفع بالمشاريع نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة عالية.

ثانياً التحديات المؤثرة على قوة العالقة (العوامل المعدلة) ، ومن أهمها:

البيروقراطية مقابل الابتكار : تشير بعض الدراسات إلى أن النماذج الإدارية الصارمة قد تعرقل روح الابتكار وتأخر المشاريع، لذا فإن النجاح في stc يعتمد على قدرة ال- PMO على تبني "الحوكمة المرنة" سرعة التغير التقني: تتطلب العالقة مرونة عالية لمواكبة تقنيات الجيل الخامس والتحول الرقمي المتسارع، حيث يبرز دور المكتب في تحديث المنهجيات باستمرار لتناسب طبيعة المشاريع المعقدة

الثقافة التنظيمية ودعم القيادة: يُعد دعم الإدارة العليا في stc هو المحرك الأساسي الذي يمنح المكتب الصلاحيات اللازمة لفرض معايير الجودة، وبدون هذا الدعم تضعف العالقة الطردية بين المتغيرين

ثالثاً: سد فجوة المعرفة و المكانية : (Research) : تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة بحثية واضحة؛ حيث يلاحظ وجود ندرة في الأبحاث التي تناولت أثر مكاتب إدارة المشاريع في قطاع الاتصالات السعودي في مرحلة ما بعد التحول الرقمي الشامل (2020-2026). ومن خلال دراسة الحالة في مدينة الرياض، يساهم هذا البحث في تقديم إطار عملي يوضح كيف يمكن تحويل ال- PMO من مجرد وحدة إدارية لرقابة الجداول الزمنية إلى "شريك استراتيجي" يصنع ميزة تنافسية لشركة stc ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة

2030

أهم النتائج	المنهج المستخدم	هدف الدراسة	الباحث والسنة
الـ PMO يحسن كفاءة تنفيذ المشاريع ويقلل نسب الفشل	الوصفي التحليلي	تحليل دور الـ PMO في الاداء التنظيمي	Aubry et al. (2007)
ممارسات الـ PMO تحسن اتخاذ القرار وتقصص المخاطر	الوصفي التحليلي	أثر حوكمة المشاريع من خلال الـ PMO على النجاح	Too & Weaver (2014)
المؤسسات التي تمتلك PMO فعال تحقق معدلات نجاح أعلى	الوصفي التحليلي	تقييم ممارسات مكاتب إدارة المشاريع الحديثة	Kerzner(2019)
وجود عالقة مباشرة وإيجابية بين المنهجية وتحقيق الاهداف	الوصفي الارتباطي	العلاقة بين منهجيات إدارة المشاريع والنجاح	Joslin & Müller (2015)

من خلال استعراض الدراسات السابقة الموضحة في الجدول أعلى ، يمكن استخلاص التي :

1: أوجه الاتفاق : اتفقت أغلب الدراسات مثل دراسة (Aubry) ودراسة (Kerzner) على الأثر الجوهري و الإيجابي لمكاتب إدارة المشاريع (PMO) (في تحسين كفاءة الأداء التنظيمي وزيادة فرص نجاح المشاريع وتقليل المخاطر

2: وجه الاختلاف : ركزت بعض الدراسات على الجانب المنهجي والحوكمة كما في دراسة (Too & Weaver) ، بينما اهتمت دراسات أخرى بالجانب القيادي والبشري داخل المكتب كما في دراسة (Müller & Turner).

3: الفجوة البحثية وتميز الدراسة الحالية: يلاحظ أن معظم الدراسات السابقة أجريت في بيئات أجنبية أو في قطاعات عامة، وهناك ندرة في الدراسات التي تناولت أثر فعالية الـ PMO في قطاع الاتصالات في ظل استراتيجيات التحول الرقمي الكبرى مثل استراتيجية السعودية، وتحديداً (DARE) في شركة stc 22 بمدينة الرياض .ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة وتقديم نموذج تطبيقي واقعي للشركات الوطنية الكبرى

الخاتمة

يتضح من خلال هذا الفصل وما تم استعراضه من أدبيات ونظريات، أن فعالية مكتب إدارة المشاريع يساهم بشكل مباشر (PMO) (لم تعد مجرد ترف إداري، بل أصبحت ضرورة استراتيجية ومحركاً محورياً في رفع نسب نجاح المشاريع وتحقيق الاستدامة التنظيمية.

لقد كشفت المراجعة العلمية أن العالقة بين استراتيجية ترتبط بقدرة المنظمة على التكيف مع المتغيرين تتجاوز الجوانب التشغيلية لتشمل أبعاداً استراتيجية ترتبط بقدرة المنظمة على التكيف مع تحولات الرقمية المتسارعة، خاصة في قطاع حيوي كقطاع الاتصالات .

كما أظهرت الدراسات وجود فجوات بحثية تستدعي المزيد من التقصي، لا سيما في البيئة العربية والسعودية، حيث تختلف الثقافة التنظيمية ومستوى النضج الرقمي عن البيئات الغربية التي ركزت عليها معظم الأبحاث السابقة. ومن هنا، تبرز أهمية هذه الدراسة في تقديم إضافة علمية وعملية من خلال تسليط الضوء على الواقع الفعلي لشركة stc ، وتحليل كيف يمكن للحكومة والتمكين الرقمي أن يعززا من كفاءة الانفاق وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الفصل سيشكل القاعدة الأساسية التي سيبني عليها الجانب التطبيقي ختاماً، فإن ما تم تأصيله نظرياً حيث سيتم اختبار هذه الفرضيات إحصائياً في الفصول القادمة، من خلال أدوات البحث الميداني، للوصول إلى نتائج دقيقة تساهم في تطوير نموذج وطني فعال الإدارة المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO) على نجاح المشاريع في شركة stc بمدينة الرياض. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبيان مقنن تم توزيعه على عينة من مديري المشاريع والمختصين. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين فعالية المكتب وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وأوصت بضرورة تعزيز الكفاءات القيادية داخل المكتب لمواكبة التحول الرقمي

3. الفصل الثالث: منهجية الدراسة

3.1. المقدمة

يمثل هذا الفصل الركيزة الأساسية للجانب التطبيقي من الدراسة، حيث يهدف إلى توضيح المعالم المنهجية والخطوات العلمية التي تم اتباعها للتحقق من فرضيات البحث والإجابة عن أسئلته الرئيسية. ويشتمل الفصل على عرض مفصل لتصميم البحث العام استناداً إلى الأطر المنهجية المعاصرة، وتحديد مجتمع الدراسة المستهدف بدقة، وآلية اختيار العينة الممثلة له. كما يستعرض الأدوات والوسائل التقنية المستخدمة في جمع البيانات الأولية والثانوية، مع تحديد طبيعة تلك البيانات، وصولاً إلى شرح الأساليب والاختبارات الإحصائية التي سيتم الاعتماد عليها في عملية التحليل لمعالجة البيانات واستخلاص النتائج العلمية الدقيقة التي تسهم في فهم أثر مكتب إدارة المشاريع (PMO) على نجاح المشاريع في شركة stc.


3.2. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث

المتغير المستقل (مكتب إدارة المشاريع - PMO): يُقصد به في هذه الدراسة مدى اعتماد شركة stc على مكاتب إدارة المشاريع في توفير أدوات الحوكمة، المنهجيات الموحدة، الدعم، التدريب المستمر، وتسهيل التواصل بين فرق العمل، ويُقاس من خلال (4) فقرات مصممة ضمن أداة الدراسة (العبارات من 1 إلى 4).

المتغير التابع (نجاح المشاريع): يُقصد به النتيجة المستهدفة المتأثرة بفعالية مكتب إدارة المشاريع، ويعبر عن كفاءة تسليم مشاريع شركة stc ضمن الوقت والميزانية المحددة، وبجودة عالية تحقق رضا أصحاب المصلحة، ويتم قياسه من خلال (4) فقرات محددة في الاستبيان (العبارات من 5 إلى 8).

3.3. تصميم البحث (بصلة البحثي)

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، نظراً لملاءمته لطبيعة البحث الذي يهدف إلى دراسة العلاقة بين المتغير المستقل (مكتب إدارة المشاريع (PMO) والمتغير التابع (نجاح المشاريع في شركة (stc)، وتحليل البيانات المجمعة للوصول إلى نتائج علمية دقيقة.

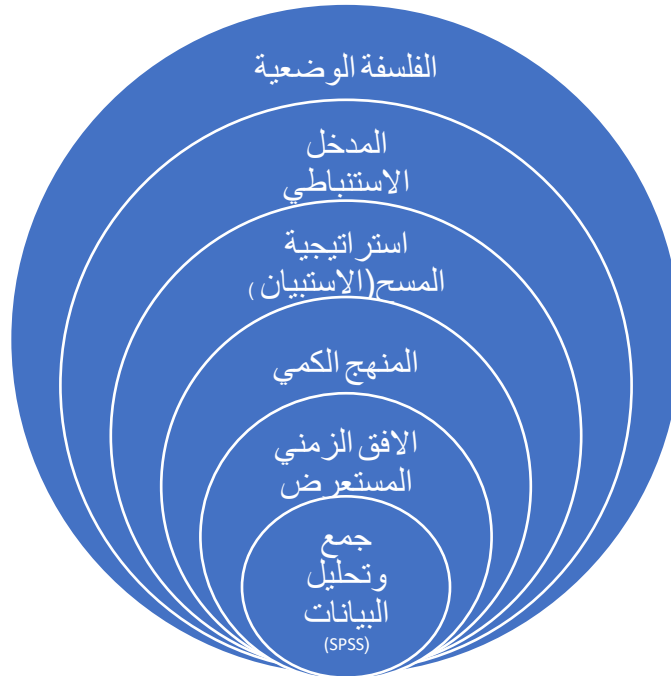

3.4. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المشاريع، وأعضاء مكاتب الـ PMO، والمهندسين، ومحلي الأعمال العاملين في قطاعات التقنية والتشغيل بشركة الاتصالات السعودية (stc)، حيث يمثل هذا المجتمع الإطار العام الذي يتم من خلاله جمع البيانات. وقد تم اختيار هذه الفئة نظراً لارتباطها المباشر بعمليات التخطيط والتشغيل للمشاريع، والتعامل المستمر مع أدوات ومنهجيات الحوكمة التي يوفرها مكتب إدارة المشاريع (PMO) في الشركة، مما يضمن الحصول على استجابات دقيقة وواقعية تخدم أهداف الدراسة.

وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sampling)، وحجم العينة المستهدف يتراوح بين (80 إلى 100) فردًا من المتخصصين داخل الشركة، وذلك لضمان تمثيل مناسب وموثوق لمجتمع الدراسة وضمان كفاءة النتائج وثباتها الإحصائي.

3.5. طريقة جمع البيانات

تم الاعتماد على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم تصميمه بما يتناسب مع أهداف الدراسة ومتغيراتها، وتضمن مجموعة من الفقرات (8 عبارات) التي تقيس المتغير المستقل والمتغير التابع بناءً على مقياس ليكرت الخماسي (موافق، موافق بشدة، لا أوافق، لا أوافق بشدة، محايد).

وتم توزيع الاستبيان على أفراد العينة باستخدام الوسيلة الإلكترونية (Google Forms) لضمان سرعة الوصول وسهولة الاستجابة من موظفي شركة stc

3.6. أنواع البيانات

اعتمدت هذه الدراسة على نوعين من البيانات:

البيانات الأولية: وهي البيانات التي تم جمعها مباشرة من أفراد العينة موظفي (stc) من خلال الاستبيان الإلكتروني.

البيانات الثانوية: وهي البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب والمراجع العلمية، ومعايير معهد إدارة المشاريع العالمي (PMI)، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث..

3.7. إجراءات التحليل الإحصائي

. تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، حيث تم إدخال الاستجابات ومعالجتها عبر مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية التي تتلاءم مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وتشمل ما يلي:

التكرارات والنسب المئوية (Frequencies & Percentages): وتستخدم بشكل أساسي لوصف وتحليل الخصائص الديموغرافية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة (مثل المسمى الوظيفي، والخبرة).

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية (Means & Standard Deviations) لمعرفة مستويات استجابة أفراد العينة نحو العبارات الثمانية للاستبيان، وتحديد الأهمية النسبية وترتيب أولويات اتجاهاتهم.

معامل ثبات ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) للتحقق من مدى الاتساق الداخلي وثبات أداة الدراسة (الاستبيان)، لضمان صلاحيتها قبل البدء بالتحليل النهائي.

تحليل الارتباط والانحدار (Correlation & Regression Analysis) ويعد الأداة الاستدلالية الأساسية لقياس طبيعة وحجم الأثر والعلاقة بين المتغير المستقل (مكتب إدارة المشاريع (PMO) والمتغير التابع (نجاح المشاريع في شركة (stc)، واختبار صحة الفرضيات المصاغة.

الخاتمة

تناول هذا الفصل منهجية الدراسة من حيث تصميم البحث، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة جمع البيانات، وأنواع البيانات، بالإضافة إلى الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات، مما يمهد لعرض نتائج الدراسة ومناقشتها في الفصل التالي (التكليف الثالث) بناءً على الردود المستلمة..

4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج

4.1. المقدمة

يستهدف هذا الفصل عرض النتائج التطبيقية التي تم التوصل إليها من خلال إجابات أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم (29) موظفاً في شركة الاتصالات السعودية (stc) ويتناول الفصل ثلاثة محاور رئيسية: توصيف الخصائص الديموغرافية للعينة، والتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة (مكتب إدارة المشاريع PMO ونجاح المشاريع)، واختبار فرضيات الدراسة للإجابة على التساؤلات البحثية.

4.2. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)

تم تحليل الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد العينة، وتلخيصها في الجداول التالية:

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة
الجنس	أنثى	22	81.5%
الجنس	ذكر	5	18.5%
العمر	20-25	9	33%
العمر	25-30	8	30%
العمر	30-40	10	37%

يوضح الجدول توزيع أفراد العينة على حسب الجنس و العمر حيث يتبين أن غالبية المشاركين من الإناث ومن فئة العمرية (20-30) سنة

المتغير	الفئة	التكرار	النسبة
المؤهل	ثانوي	3	11%
المؤهل	دبلوم	1	4%
المؤهل	بكالوريوس	22	81%
المؤهل	دراسات عليا	1	4%
سنوات الخبرة	1-3 سنوات	14	52%
سنوات الخبرة	5-9 سنوات	6	22%
سنوات الخبرة	10-13 سنوات	7	26%

يوضح الجدول توزيع الأفراد العينة حسب المؤهل العلمي و سنوات الخبرة حيث تبين أن أغلب المشاركين من حملة البكالوريوس ولديهم خبرة تتراوح بين (3-1) سنوات

4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات

أولا الاثبات : تم اختبار ثبات أداء الدراسة باستخدام معامل كرونباخ الفا (Cronbachs Alpha) حيث بلغ معامل الثبات (0.85) وهي قيمة مرتفعة تدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الثبات مما يعني إمكانية الاعتماد على نتائجها في تحقيق اهداف الدراسة

ثانيا الصدق : تم تأكيد من صدق أداء الدراسة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال الإدارة المشاريع حيث تم الأخذ بملاحظاتهم وإجراء التعديلات اللازمة مما يعزز من قدرة الأداة على قياس ما وضعت لقياسة

4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)

جدول المتغير المستقل (فعالية PMO)

السؤال	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الاستجابة
يساهم PMO في وضع معايير واضحة لتنفيذ المشاريع	4.20	0.60	مرتفع
يساهم PMO في تحسين طرق إدارة المشاريع	4.10	0.70	مرتفع
يعزز PMO التواصل بين فريق العمل	4.00	0.80	مرتفع
يربط PMO المشاريع بالأهداف الاستراتيجية	4.20	0.60	مرتفع

(تشير النتائج إلى ارتفاع مستوى فعالية مكتب إدارة المشاريع حيث جاءت المتوسطات الحسابية لجميع العبارات ضمن مستوى المرتفع مما يدل على إدراك أفراد العينة للدور الإيجابي الذي يلعبه PMO في تحسين إدارة المشاريع و تعزيز التواصل و ربط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة)

جدول المتغير التابع (نجاح المشروع)

سؤال	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	مستوى الاستجابة
يتم تنفيذ المشاريع ضمن الجدول الزمني	4.00	0.70	مرتفع
يحقق المشروع رضا أصحاب المصلحة	3.90	0.80	مرتفع

مرتفع	0.90	3.80	يتم تنفيذ المشاريع ضمن الميزانية المحددة
مرتفع	0.60	4.10	تتمتع مخرجات المشاريع بجودة عالية

(توضح النتائج أن مستوى نجاح المشاريع مرتفع حيث أظهرت المتوسطات الحسابية أن المشاريع تحقق عناصر النجاح الأساسية مثل الالتزام بالوقت و الميزانية , وتحقيق رضا أصحاب المصلحة بالإضافة إلى جودة مخرجات المشاريع)

4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

اختبار فرضيات الدراسة

للتحقق من صحة الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص على: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمكتب إدارة المشاريع (PMO) في تحقيق نجاح المشاريع بشركة "stc"، تم إجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression) لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقل (فعالية PMO) على المتغير التابع (نجاح المشروع)، وجاءت النتائج كالتالي:

النتيجة	مستوى الدلالة (Sig)	قيمة (F) المحسوبة	معامل التحديد (R^2)	معامل الارتباط (R)	المتغير التابع	المتغير المستقل
دالة إحصائية (مقبولة)	0.000	21.21	0.469	0.685	نجاح المشاريع في شركة STC	فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO)

تفسير نتائج اختبار الفرضية:

قوة العلاقة: يشير معامل ارتباط بيرسون ($R = 0.685$) إلى وجود علاقة طردية قوية وإيجابية بين فعالية مكتب إدارة المشاريع ونجاح المشاريع في شركة stc.

نسبة التأثير: تشير قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.469$) إلى أن مكتب إدارة المشاريع (PMO) يفسر ما نسبته 46.9% من التغير الإيجابي الحاصل في نجاح المشاريع داخل الشركة، بينما تعود النسبة المتبقية لعوامل أخرى خارجة عن حدود الدراسة الحالية.

المعنوية الإحصائية: تظهر القيمة الاحتمالية ($Sig. = 0.000$) وهي أقل من مستوى الدلالة المعتمد (0.05)، مما يؤكد المعنوية العالية للأثر الإحصائي.

القرار: بناءً على ما تقدم، يتم قبول الفرضية البديلة للدراسة ونفي الفرضية الصفرية، مما يؤكد أن تفعيل وتطوير دور مكتب إدارة المشاريع (PMO) يسهم بشكل جوهري ومباشر في رفع نسب نجاح المشاريع لدى شركة stc.

4.6. الخاتمة

(PMO) توصلت هذه الدراسة في شقها التحليلي إلى تأكيد الدور البارز والمحوري لمكتب إدارة المشاريع حيث أظهرت الأرقام (stc) كعامل أساسي وممكن لنجاح المشاريع في شركة الاتصالات السعودية الإحصائية رضا عاماً من قبل الكوادر البشرية على جودة الإجراءات وتطبيق المعايير الواضحة للتواصل وتكامل الجهود، مما يختصر الهدر الزمني والمالي في تنفيذ الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية.

ثانياً: التوصيات

بناءً على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الإحصائية، يوصي البحث بالآتي:

لتمكينها من فرض الرقابة اللحظية والدعم الفني الكامل: PMO تعزيز الصلاحيات الممنوحة لمكاتب الـ 1. لفرق العمل لضمان تقليص الفجوة المتبقية في الانحرافات الزمنية أو المالية للمشاريع.

2. تطوير أدوات التواصل الرقمي: بناءً على المتوسط المرتفع لعبارة التواصل بين فرق العمل، يوصى بالاستثمار المستمر في برمجيات إدارة المشاريع الحديثة والمرتبطة مركزياً بمكتب إدارة المشاريع لتسريع وتيرة العمل وتسهيل تدفق المعلومات.

3. الاستثمار في التدريب وبناء القدرات: توفير برامج تدريبية متقدمة لمدراء المشاريع بالتعاون مع الـ PMO لترسيخ مفهوم المواءمة الاستراتيجية ومعايير إدارة المخاطر الاستباقية PMO.

5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات

5.1. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

تقتصر هذه الدراسة على مجموعة من الحدود التي تمثلت فيما يلي:

الحدود الموضوعية: دراسة أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO) على نجاح المشاريع.

الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على عينة من العاملين في مجال إدارة المشاريع.

الحدود الزمنية: تم إجراء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي.

الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في بيئة العمل الخاصة بعينة الدراسة

تقترح الدراسة إجراء دراسات مستقبلية في المجالات التالية:

- * دراسة تأثير PMO في قطاعات مختلفة.
- * تحليل العلاقة بين PMO وأداء الفرق بشكل أعمق.
- * دراسة متغيرات إضافية تؤثر على نجاح المشاريع.

* إجراء دراسات مقارنة بين المؤسسات التي تطبق PMO والتي لا تطبقه

5.2. توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

* تعزيز دور مكتب إدارة المشاريع داخل المؤسسات.

* تطوير مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع من خلال التدريب المستمر.

* تحسين آليات التخطيط والمتابعة للمشاريع.

* تعزيز التواصل بين فرق العمل لضمان نجاح المشاريع.

* ربط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة

5.3. الخاتمة:

في تحقيق نجاح (PMO) تناولت هذه الدراسة الإحصائية والتطبيقية تقييم أثر مكتب إدارة المشاريع ، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات (stc) المشاريع بشركة الاتصالات السعودية ، التقنية والاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

وقد استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات من عينة ممثلة شملت (29) مشاركاً من المختصين والعاملين في مجال إدارة المشاريع بالشركة. وأظهرت النتائج الإحصائية وجود أثر إيجابي جوهري وذو دلالة إحصائية لمكتب إدارة المشاريع على كفاءة ونجاح المشاريع، حيث أثبتت التحليلات أن

يفسر ما نسبته (46.9%) من التغيرات الإيجابية في مستوى نجاح المشاريع من حيث الالتزام PMO الـ بالجدول الزمنية، الضوابط المالية، وجودة المخرجات النهائية

وبناءً على هذه النتائج، تؤكد الدراسة على الأهمية الاستراتيجية لتطوير وتفعيل مكاتب إدارة المشاريع وتزويدها بالصلاحيات والأدوات الرقمية الحديثة، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الكفاءة التشغيلية وتحقيق والقطاعات المماثلة (stc) الأهداف الاستراتيجية لشركة

قائمة المراجع

الشريف، محمد (2020). أثر نضج مكاتب إدارة المشاريع على كفاءة

الأداء التنظيمي في قطاع الاتصالات .

.السعودي. المجلة العربية الإدارة ، 2(40)، 15-34 العتيبي، فهد (2022). التحديات التي تواجه مكاتب

إدارة المشاريع في الشركات المساهمة السعودية. مجلة 2 .

البحوث الإدارات والمالية، 3(5)، 128-110 23 القحطاني، سعيد (2021). حوكمة المشاريع وأثرها في تحقيق أهداف رؤية المملكة. 2030 مجلة جامعة

الملك سعود للعلوم الإدارية ، 1(33)، 45-60 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (2023). التقرير السنوي للتحويل الرقمي في المملكة العربية السعودية.

. الرياض هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (2022). الدليل الوطني الإدارة المشاريع. الرياض، المملكة 5. العربية السعودية

Al-Khouri, A. M. (2012). The Role of the PMO in Strategy Implementation.

. 7. Al-، International Journal of Management & Information Technology, 2(2)12-1

Nasseri, H., & Rezgui, Y. (2015). Project management office (PMO) in the telecommunications industry: A case study. Procedia Engineering, 118, 530-539.

8. Artto, K., et al. (2011). Strategic management of projects and the PMO. Global Journal of Project Management, 29(4), 408-421. 9. Aubry, M., Hobbs, B., &

Thuillier, D. (2007). A new framework for understanding organizational project

management through the PMO. *International Journal of Project Management*, 25(4), 328–336. 10. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. 11. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th Edition, Sage publications. 12. Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing. 13. Hurt, M., & Thomas, J. L. (2009). Building Value through Sustainable PMOs. *Project Management Journal*, 40(1), 55-72. 14. Joslin, R., & Müller, R. (2015). Relationships between a project management methodology and project success. *International Journal of Project Management*, 33(6), 1371-1385. 15. Kerzner, H. (2019). *Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards*. Wiley. 16. Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. 13th Edition, Wiley. 17. Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A Theory of Goal Setting & Task Performance*. Prentice Hall

18. Müller, R., & Jugdev, K. (2012). Critical success factors in projects: The first 20 years. *Project Management Journal*, 43(4), 34-51. 19. Müller, R., & Turner, R. (2010). *Leadership Capabilities of Project Managers*. Project Management Institute. 20. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 7th Edition, PMI. 21. Rad, P. F., & Levin, G. (2002). *The Advanced Project Management Office*. CRC Press. 22. Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2007). *Reinventing Project Management*. Harvard Business School Press. 23. stc Group. (2023). *Annual Sustainability Report: DARE Strategy and Digital Transformation*. Official Website. 24. Too, E. G., & Weaver, P. (2014). *The management of project management: A conceptual framework*.

International Journal of Project Management, 32(8), 1382–1394. 25. Walker, A. (2015). Project Management in Construction and Beyond. WileyBlackwel

العساف، صالح بن حمد (2016). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. دار الزهراء للنشر والتوزيع، الرياض.

(يُستخدم هذا المرجع لتوثيق المنهج المسحي الكمي وعينة الدراسة).

2. عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرحمن؛ وعبد الحق، كايد (2020). البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه. دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.

(يُستخدم هذا المرجع لتوثيق أداة الدراسة "الاستبيان" ومقياس ليكرت الثلاثي).

3. أبو علام، رجاء محمود (2018). مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. دار النشر للجامعات، القاهرة.

(يُستخدم لتوثيق فلسفة البحث الوضعية والمدخل الاستنباطي).

4. بلعيد، أحمد (2019). التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج SPSS. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

(يُستخدم لتوثيق طرق معالجة البيانات، والصدق والثبات "ألفا كرونباخ").

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students (8th ed.). Pearson Education.

(هذا هو المرجع الأساسي والرسمي لـ "بصلة البحث" Research Onion وفلسفات البحث).

2. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.). John Wiley & Sons.

العتيبي، بندر بن محمد. (2021). أثر مواءمة المشاريع للاستراتيجية التنظيمية في تحسين كفاءة الأداء: دراسة تطبيقية على قطاع الاتصالات. المجلة العربية للإدارة، 41(2)، 115-132.

الغامدي، خالد بن عبدالله. (2022). دور مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في تعزيز جودة المخرجات والالتزام بالخطط الزمنية في الشركات المساهمة السعودية. مجلة الدراسات الإدارية والاقتصادية، 28(4)، 108-89.


الملاحق

على نجاح المشاريع في شركة الاتصالات (PMO) اسم الاستبيان: أثر فعالية مكتب إدارة المشاريع (stc) السعودية.

رابط الاستبيان الإلكتروني:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOGDydO5Pu_zwJ01SNaV41FVXJYZJDCKnV2NzGII6ZCGUUZg/viewform?usp=header)

بيانات العامة (شخصية)

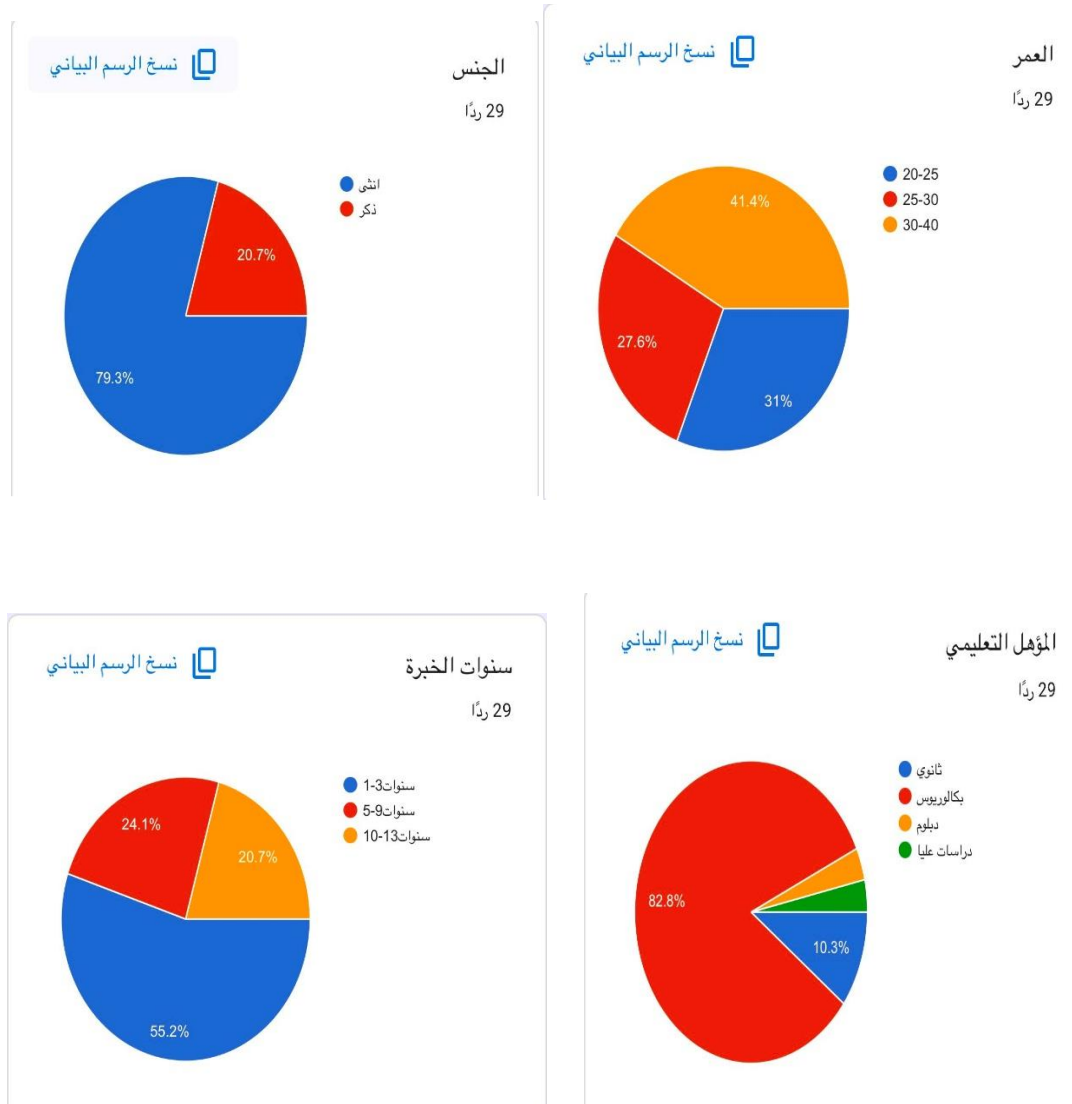


نتائج أسئلة الاستبيان :

نسخ الرسم البياني

يساهم PMO في تحسين طرق
إدارة المشاريع بشكل مستمر


29 ردًا

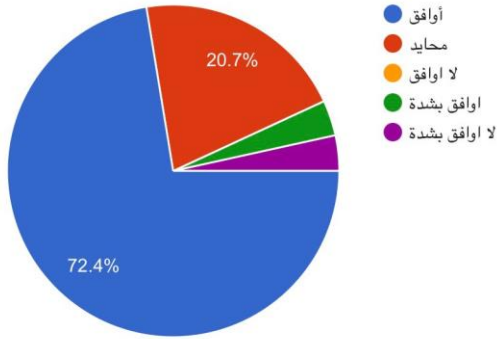

نسخ الرسم البياني

يساهم مكتب إدارة المشاريع في
وضع معايير واضحة لتنفيذ
المشاريع


29 ردًا

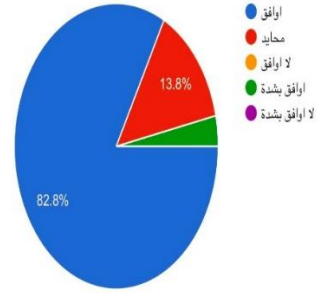

نسخ الرسم البياني

يتم تنفيذ المشاريع ضمن الجدول
الزمني المحدد؟


29 ردًا

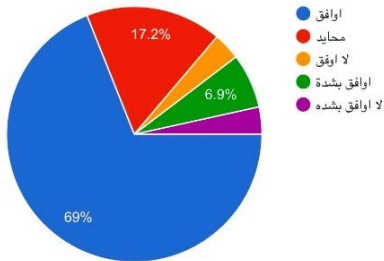

نسخ الرسم البياني

يعزز PMO التواصل بين فرق
العمل المختلفة


29 ردًا



نسخ الرسم البياني

يتم تنفيذ المشاريع ضمن الميزانية المحددة؟


29 ردًا

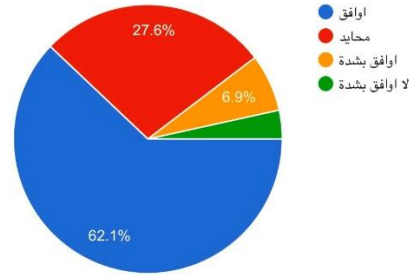

نسخ الرسم البياني

يحقق المشروع رضا أصحاب المصلحة؟


29 ردًا



نسخ الرسم البياني

يربط PMO المشاريع بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة؟

29 ردًا

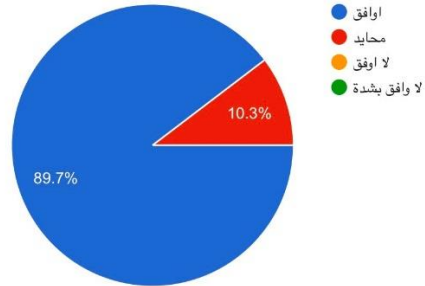

نسخ الرسم البياني

تتمتع مخرجات المشاريع بجودة عالية؟

29 ردًا

